
















Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

| Sector | Original | Modificado A | Ejercido C | Avance Ejercido % D=C/A | Saldo E=A-C | Reserva F | Comprometido G | Disponible H=E-F-G |
|--|-----------|--------------|------------|----------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------------|
| <div> Central</div> | 46,404.3 | 50,065.0 | 32,643.8 | 65.2 % | 17,421.2 | | 14,470.3 | 2,950.9 |
| <div> Conservación de Carreteras</div> | 23,638.8 | 20,086.7 | 13,237.2 | 65.9 % | 6,849.6 | | 5,604.3 | 1,245.3 |
| <div> Caminos Rurales y Alimentadores</div> | 15,720.4 | 9,928.6 | 5,091.6 | 51.3 % | 4,837.0 | | 4,193.4 | 643.6 |
| <div> Carreteras Federales</div> | 0.0 | 12,450.1 | 7,328.7 | 58.9 % | 5,121.4 | | 4,230.3 | 891.1 |
| <div> Desarrollo Carretero</div> | 7,045.1 | 6,479.0 | 6,324.9 | 97.6 % | 154.1 | | 27.7 | 126.4 |
| <div> Servicios Técnicos</div> | 0.0 | 552.3 | 353.0 | 63.9 % | 199.3 | | 173.4 | 25.9 |
| <div> Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural</div> | 0.0 | 517.7 | 258.0 | 49.8 % | 259.8 | | 241.1 | 18.7 |
| <div> Dirección General de Recursos Materiales</div> | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 % | 0.0 | | 0.0 | |
| <div> Subsecretaría de Comunicaciones y Transporte</div> | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 % | 0.0 | | 0.0 | |
| <div> Coordinado</div> | 92,000.0 | 88,959.3 | 45,477.1 | 51.1 % | 43,482.2 | 5,023.09 | 4,161.6 | 34,297.5 |
| <div> Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario</div> | 0.0 | 85,952.7 | 42,656.6 | 49.6 % | 43,296.2 | 5,023.09 | 4,161.5 | 34,111.6 |
| <div> Desarrollo Ferroviario y Multimodal</div> | 92,000.0 | 2,999.2 | 2,820.5 | 94.0 % | 178.7 | | 0.0 | 178.7 |
| <div> Instituto Mexicano del Transporte</div> | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 42.6 % | 0.0 | | 0.0 | |
| <div> Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano</div> | 0.0 | 7.2 | 0.0 | | 7.2 | | 0.0 | 7.2 |
| Total | 138,404.3 | 139,024.3 | 78,121.0 | 56.2 % | 60,903.3 | 5,023.09 | 18,631.9 | 37,248.4 |


Nota: Se incorporan las cifras de la reserva a partir del 10 de abril de 2025.

Programación PEF

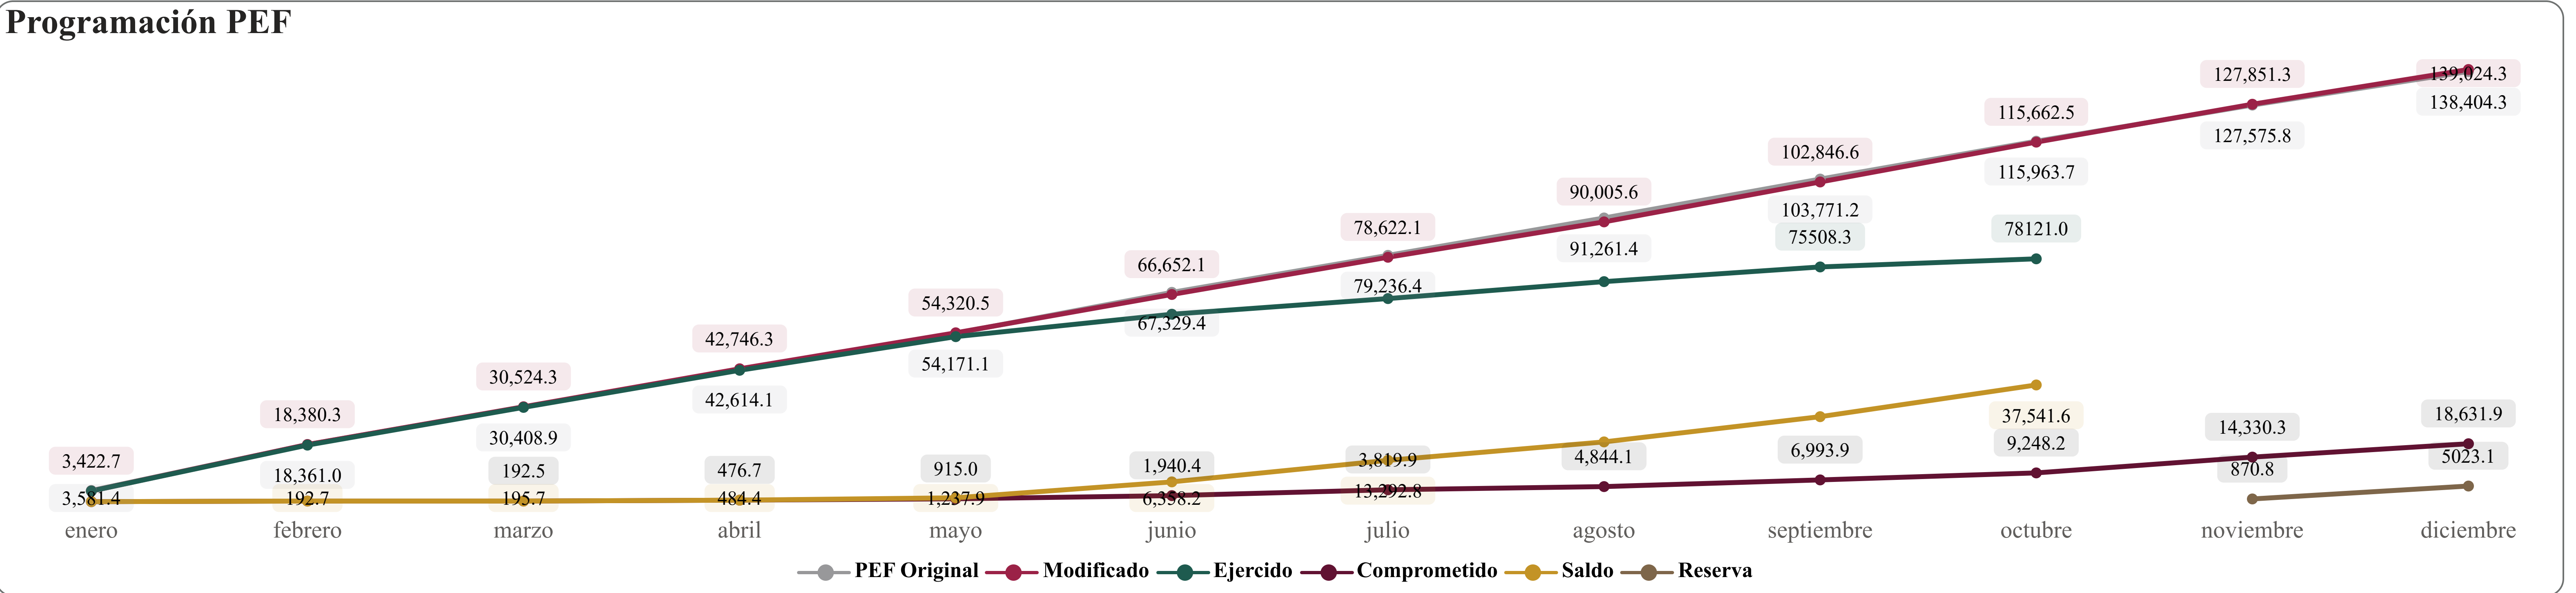


Ejercido en la semana por áreas


| Nom_Unidad | Ejercido al cierre del 16 de oct | Ejercido al cierre del 23 de oct | Ejercido entre periodos | Saldo al año |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Conservación de Carreteras | 12,755.4 | 13,237.2 | 481.7 | 6,849.6 |
| Caminos Rurales y Alimentadores | 4,532.3 | 5,091.6 | 559.4 | 4,837.0 |
| Carreteras Federales | 6,992.5 | 7,328.7 | 336.2 | 5,121.4 |
| Desarrollo Carretero | 6,324.9 | 6,324.9 | 0.0 | 154.1 |
| Servicios Técnicos | 343.7 | 353.0 | 9.3 | 199.3 |
| Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario | 42,008.4 | 42,656.6 | 648.2 | 43,296.2 |
| Desarrollo Ferroviario y Multimodal | 2,820.5 | 2,820.5 | 0.0 | 178.7 |
| Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural | 209.3 | 258.0 | 48.7 | 259.8 |
| Dirección General de Recursos Materiales | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Instituto Mexicano del Transporte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| Subsecretaria de Comunicaciones y Transporte | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 76,037.5 | 78,121.0 | 2,083.4 | 60,903.3 |

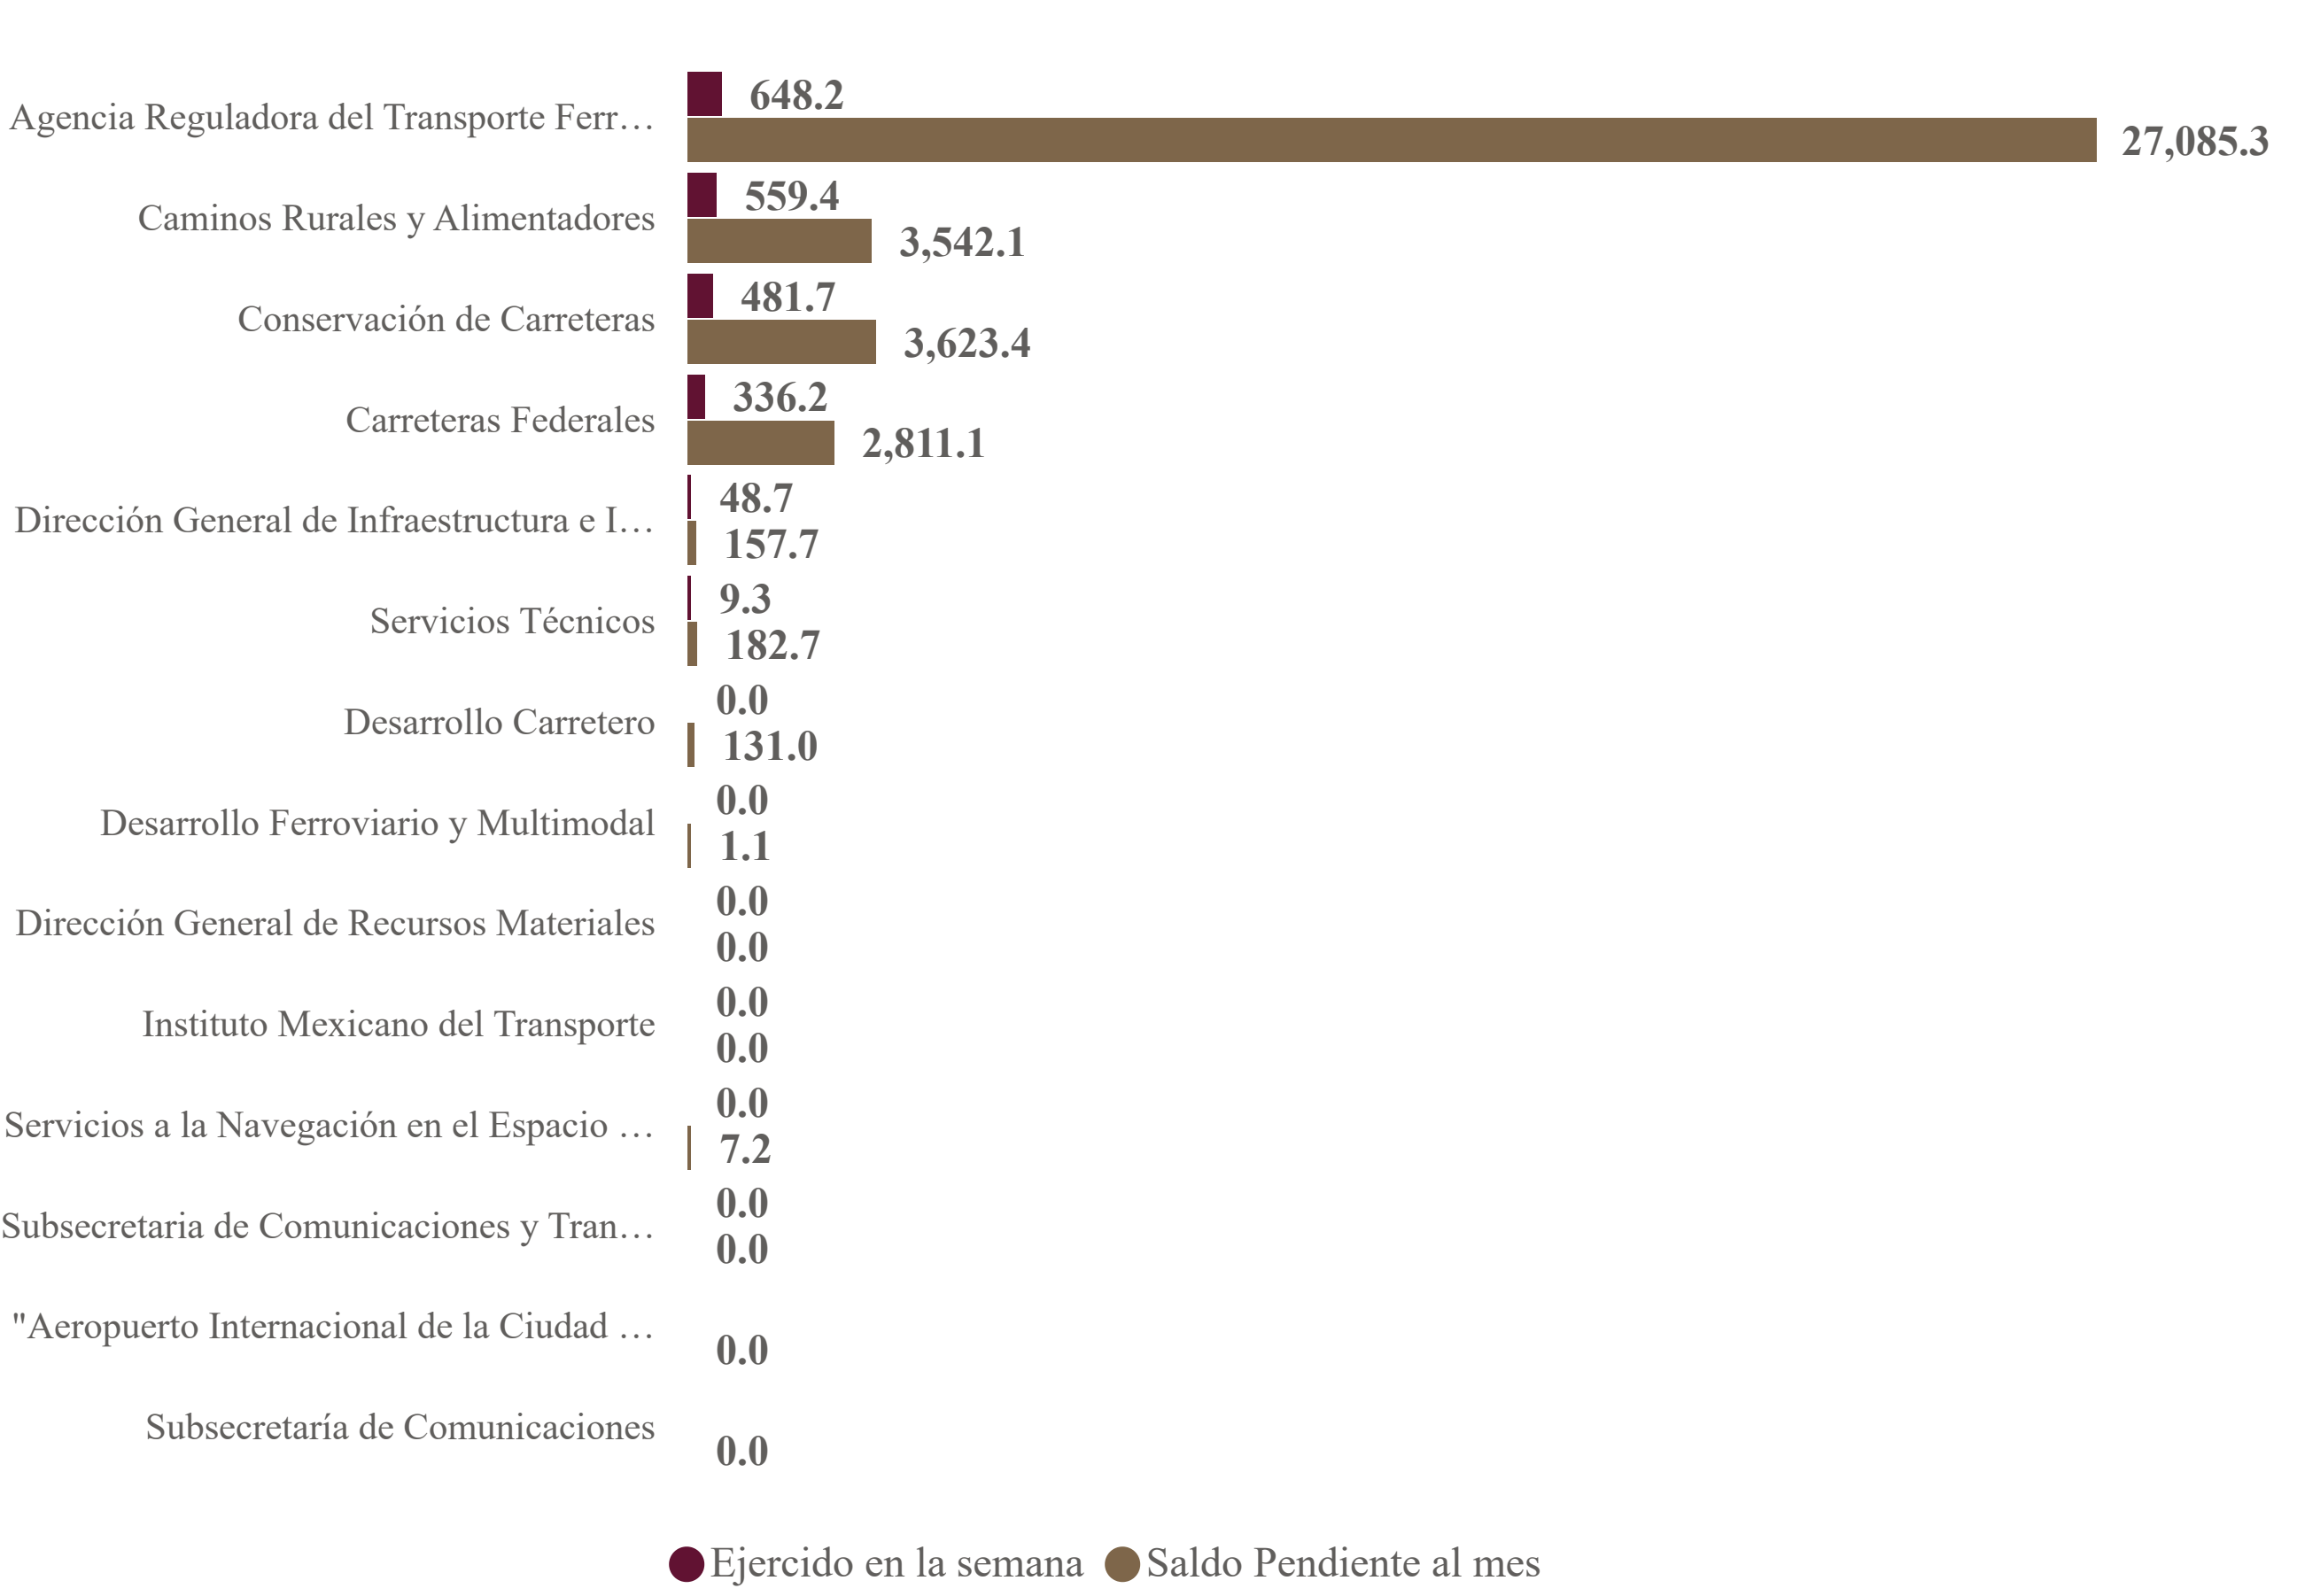

Histórico de ejercido

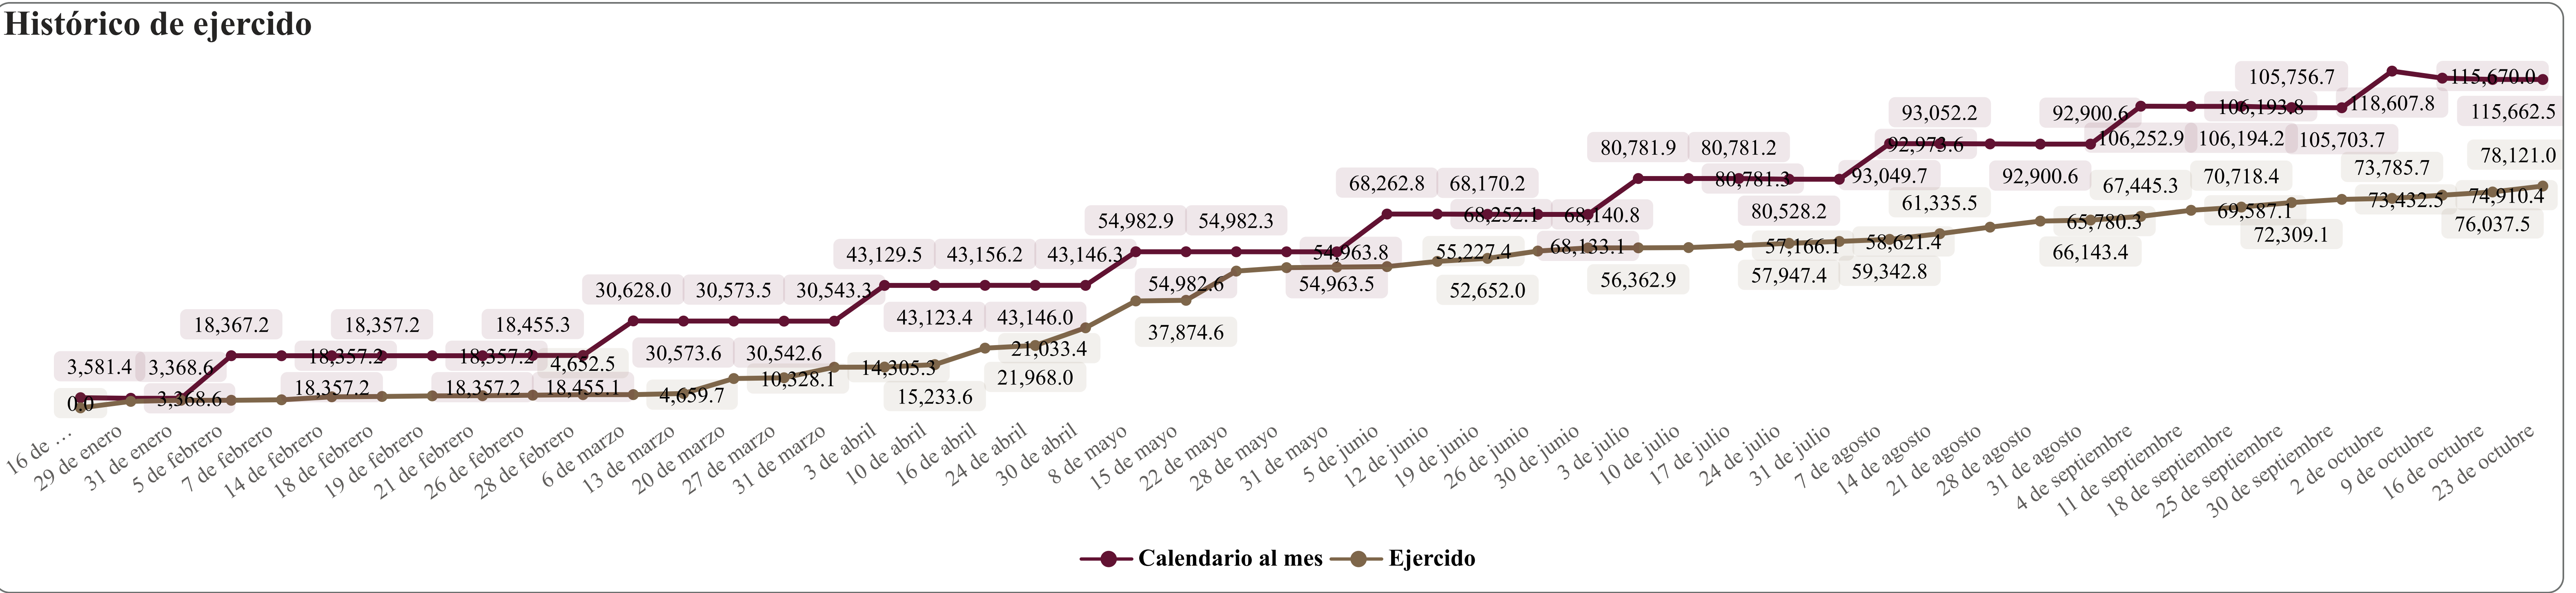

Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año

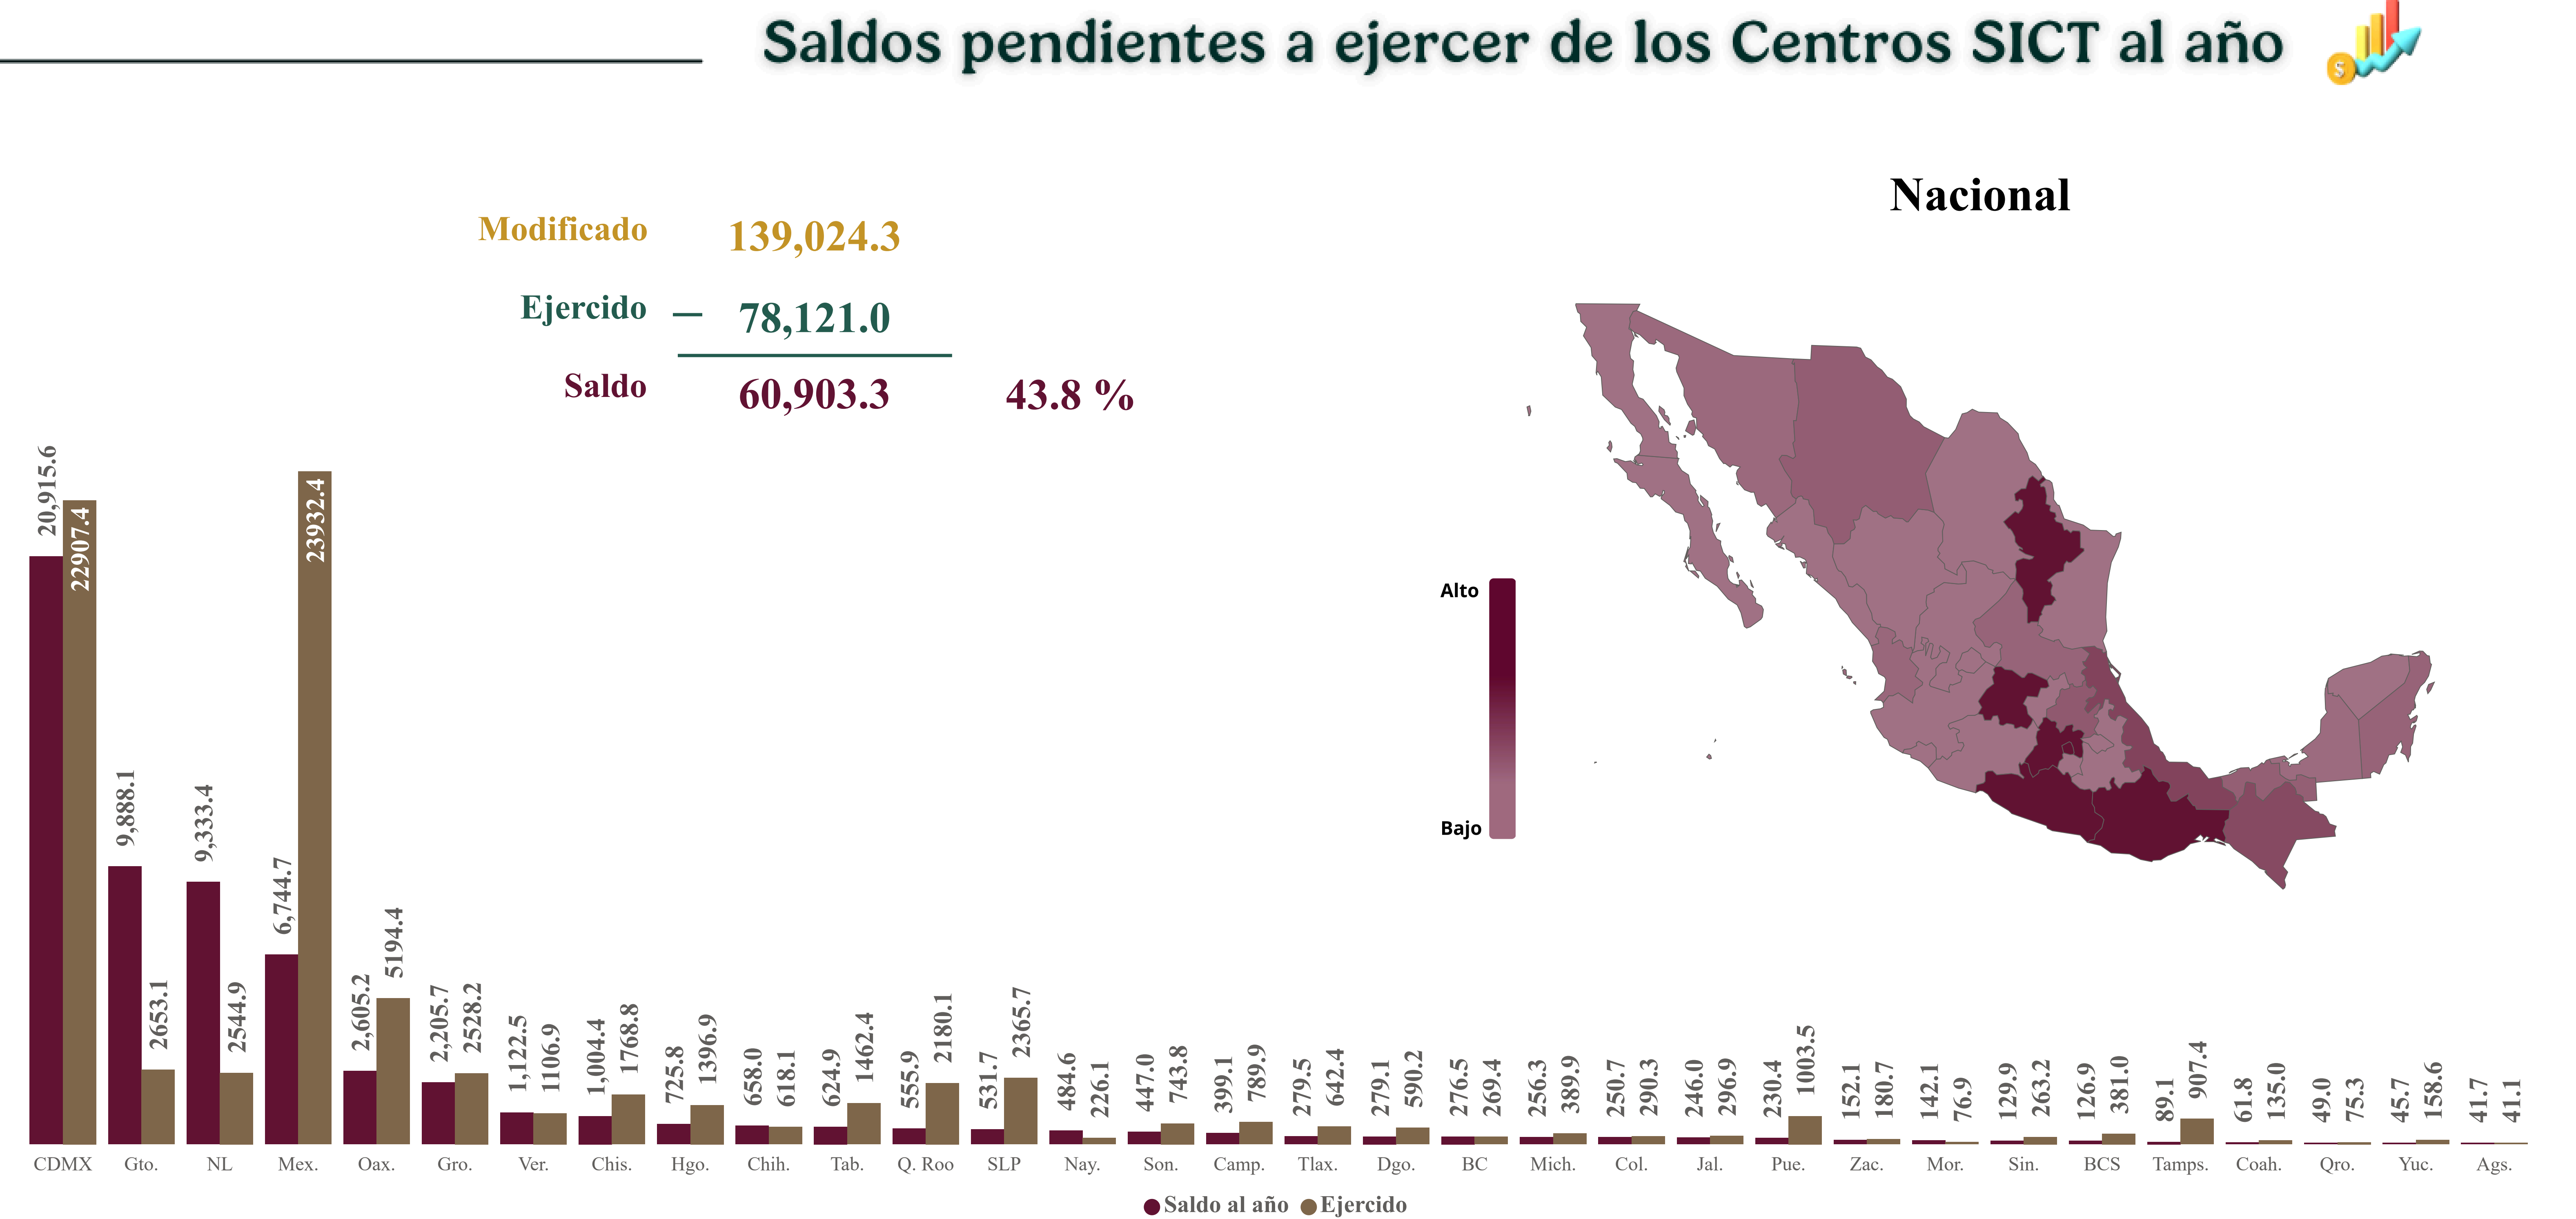

Bitácoras de obras nuevas

| Fecha de Corte | Unidad | Pp | ID_Cv | Obras del SICT | Modificado |
|------------------|--------|------|-------------|---|------------|
| 9 de octubre | 626 | K033 | 24092100002 | Programa de estudios y proyectos de carreteras 2025 | 20.0 |
| 30 de septiembre | 637 | K037 | 24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | 114.3 |
| 18 de septiembre | 645 | K037 | 24092100003 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025. | 20.0 |
| 18 de septiembre | 641 | K048 | 25096410002 | Puebla-Huajuapán de León, Tramo: El Pitayo-Acatlán de Osorio | 15.0 |
| 18 de septiembre | 634 | K048 | 25096340001 | Puente Amado Nervo (Federación) | 30.0 |
| 18 de septiembre | 638 | K048 | 25096340001 | Puente Amado Nervo (Federación) | 20.0 |
| 11 de septiembre | 300 | K027 | 25093000005 | Construcción de Senderos Seguros 10 Municipios Estado de México | 56.0 |
| 4 de septiembre | 300 | K027 | 25093000003 | Construcción de Senderos Seguros- Valle de Chalco, Estado de México | 14.5 |
| 4 de septiembre | 623 | K048 | 25092100002 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025 | 3.8 |
| 4 de septiembre | 624 | K048 | 25092100002 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025 | 2.0 |
| 4 de septiembre | 627 | K048 | 25092100002 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025 | 0.6 |
| 4 de septiembre | 634 | K048 | 25092100002 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025 | 1.8 |
| 4 de septiembre | 635 | K048 | 25092100002 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025 | 0.1 |
| 4 de septiembre | 639 | K048 | 25092100002 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025 | 0.1 |
| 4 de septiembre | 643 | K048 | 25092100002 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025 | 1.5 |
