

Secretaría de Infraestructura,

Comunicaciones y Transportes

Total

Subsecretaría de Comunicaciones y Agencia Reguladora del Transporte Subsecretaría de Infraestructura **Transportes** Ferroviario

142,342.3

66,143.4

46.5 %

76,198.9

5,883.50

Centro SCOP

Mes

52,697.6


Año

17,617.8

Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual


Trance I manerers de inversion por unidad, programa presupaestario y projecto i inda									
Nom_Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G	
□ Central	46,404.3	50,831.5	24,003.1	47.2 %	26,828.4	655.09	17,384.6	8,788.7	
+ Conservación de Carreteras	23,638.8	20,109.3	9,930.9	49.4 %	10,178.4		6,168.1	4,010.3	
Caminos Rurales y Alimentadores	15,720.4	11,031.8	2,903.5	26.3 %	8,128.3	655.09	5,381.1	2,092.1	
+ Carreteras Federales	0.0	12,077.0	4,953.1	41.0 %	7,124.0		5,139.8	1,984.1	
Desarrollo Carretero	7,045.1	6,495.1	5,931.9	91.3 %	563.3		8.9	554.3	
+ Servicios Técnicos	0.0	550.0	231.8	42.1 %	318.2		268.7	49.5	
🛨 Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural	0.0	517.7	51.4	9.9 %	466.3		367.9	98.4	
Dirección General de Recursos Materiales	0.0	0.5	0.5	100.0 %	0.0		0.0		
Subsecretaria de Comunicaciones y Transporte	0.0	50.0	0.0		50.0		50.0		
□ Coordinado	92,000.0	91,510.8	42,140.2	46.0 %	49,370.5	5,228.41	233.2	43,908.9	
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario	0.0	88,681.7	39,319.8	44.3 %	49,362.0	5,228.41	233.2	43,900.4	
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	92,000.0	2,821.7	2,820.4	100.0 %	1.3		0.0	1.3	
Instituto Mexicano del Transporte	0.0	0.1	0.0	42.6 %	0.0		0.0	0.0	
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	0.0	7.2	0.0		7.2		0.0	7.2	

138,404.3

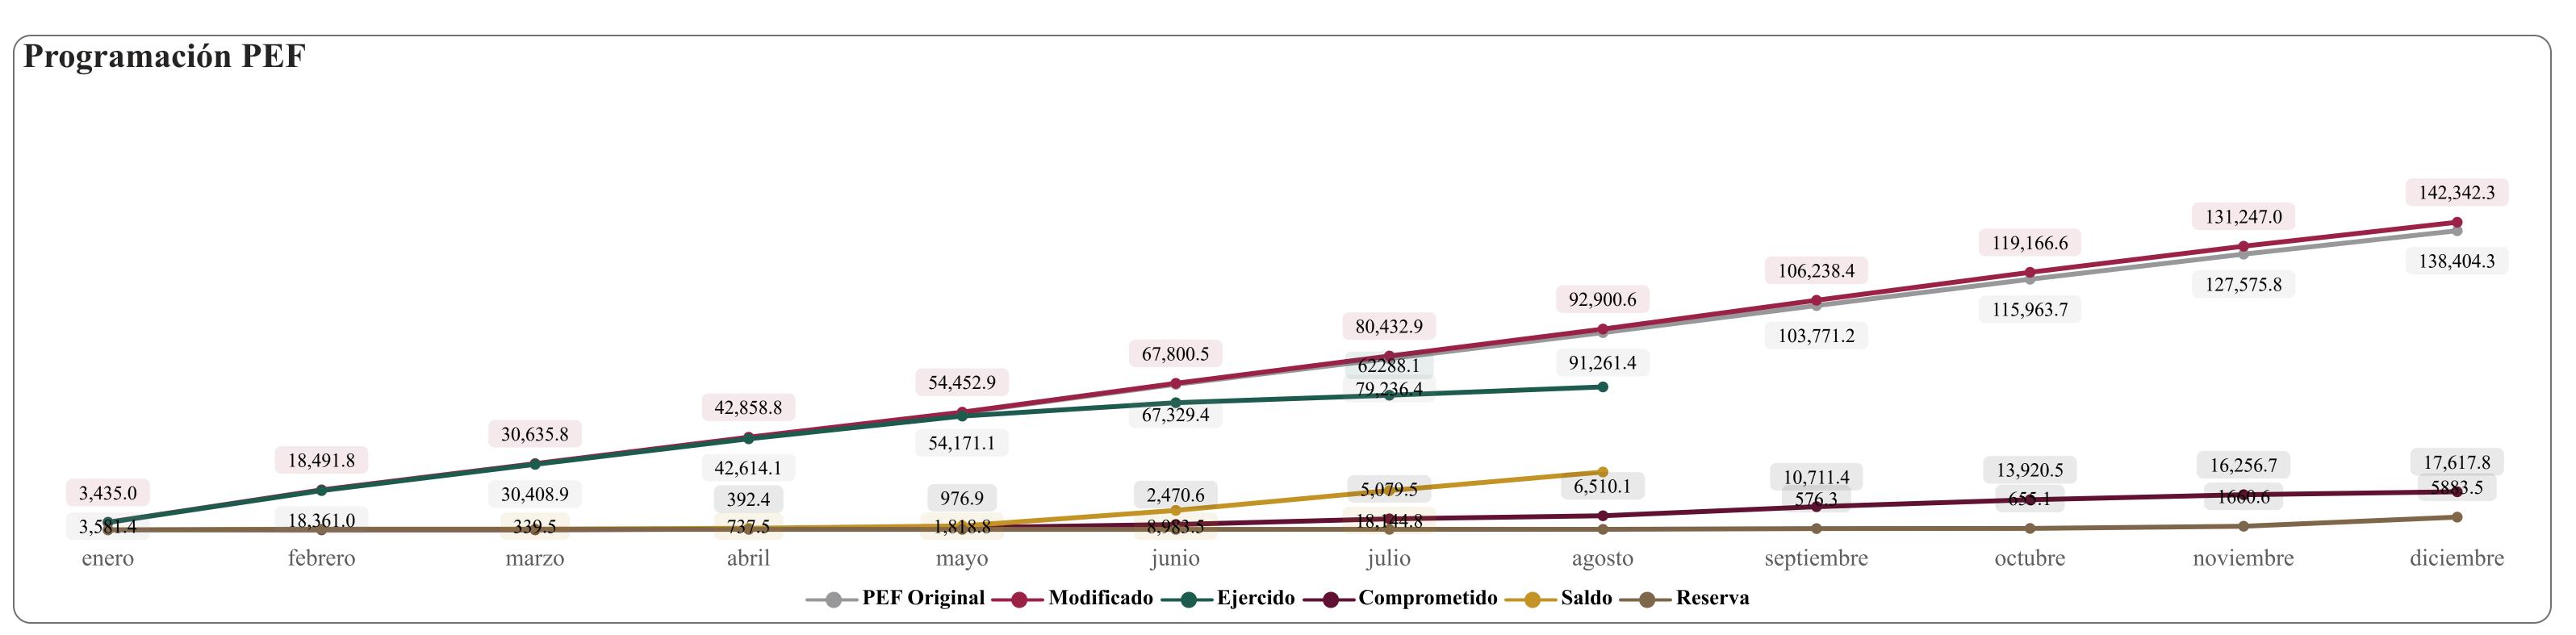

Ejercido en la semana por áreas

Nom_Unidad	Ejercido al cierre	Ejercido al cierre	Ejercido entre	Saldo al año	
	del 28 de ago	del 31 de ago	periodos		
Conservación de Carreteras	9,865.6	9,930.9	65.4	10,178.4	
Caminos Rurales y Alimentadores	2,789.1	2,903.5	114.4	8,128.3	
Carreteras Federales	4,829.5	4,953.1	123.5	7,124.0	
Desarrollo Carretero	5,931.9	5,931.9	0.0	563.3	
Servicios Técnicos	203.0	231.8	28.8	318.2	
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario	39,288.8	39,319.8	31.0	49,362.0	
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	2,820.4	2,820.4	0.0	1.3	
Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural	51.4	51.4	0.0	466.3	
Dirección General de Recursos Materiales	0.5	0.5	0.0	0.0	
Instituto Mexicano del Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	0.0	0.0	0.0	7.2	
Subsecretaria de Comunicaciones y Transporte	0.0	0.0	0.0	50.0	
Total	65,780.3	66,143.4	363.1	76,198.9	

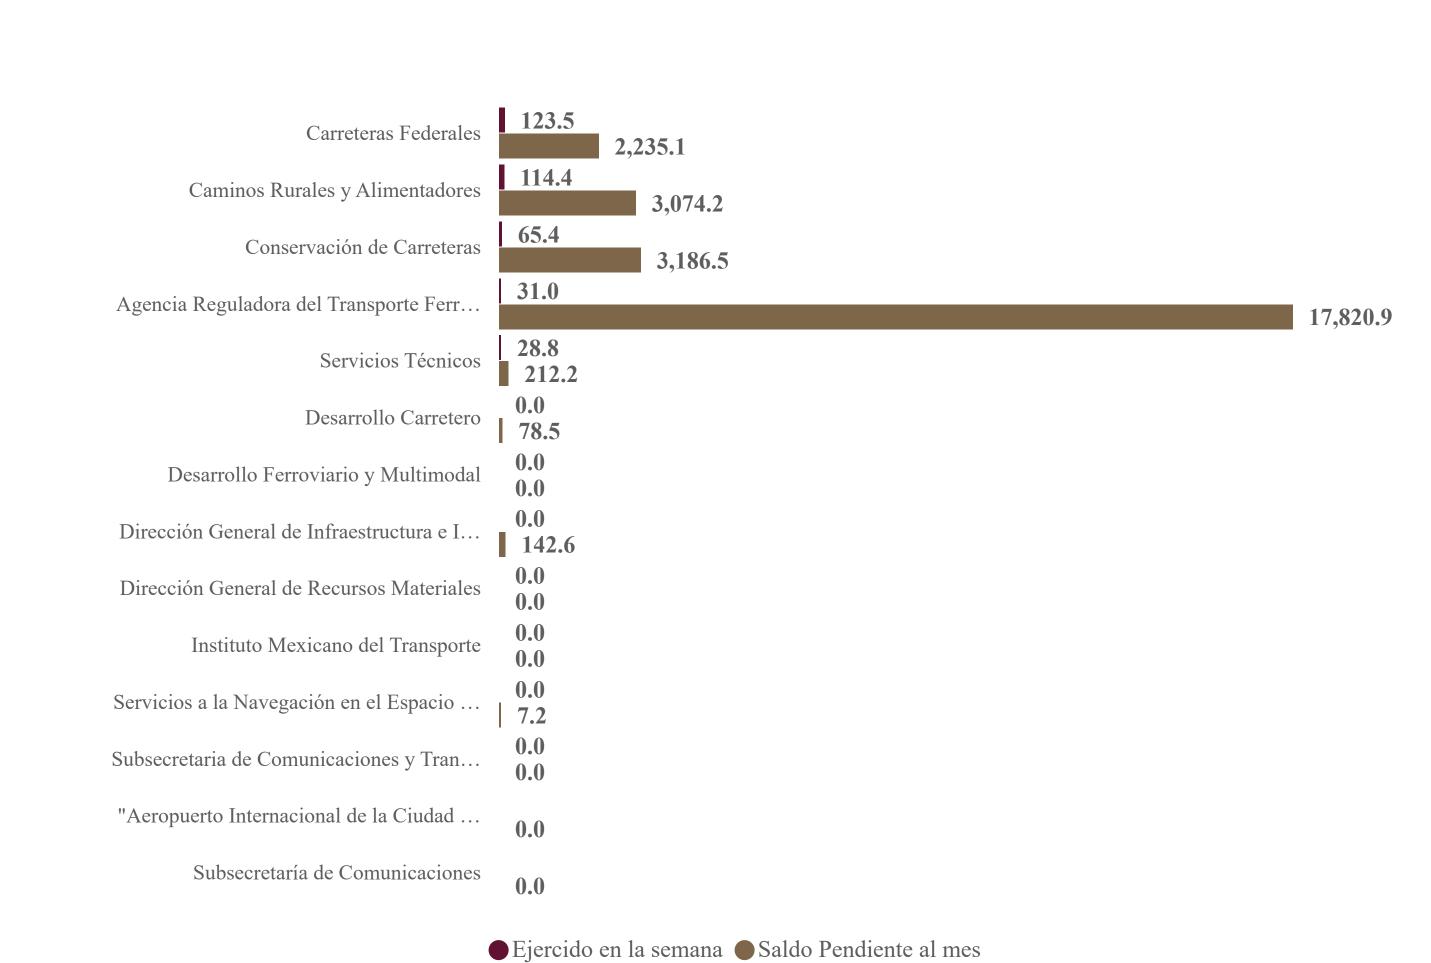


Histórico de ejercido 92,900.6 80,781.2 80,781.9 93,052.2 92,900.6 68,262.8 68,170.2 63,650.8 66,143.4 80,528.2 57,947.4 80,781.3 59,342.8 56,457.9 54,982.9 54,982.3 68,252.1 68,133.1 65,780.3 61,335.5 43,156.2 43,146.3 43,129.5 49,749.4 51,587.3 58,621.4 55,227.4 56,362.9 54,982.6 54,963.5 30,573.5 30,543.3 43,123.4 37,874.6 18,367.2 18,357.2 18,455.3 30,542.6 30,573.6 21,968.0 28,195.2 5,052.2 21,033.4 3,581.4 3,368.6 18,357.2 18,455.1 18,357.2 14,305.3 10,328.1 16 de 29 de 31 de 5 de 7 de 14 de 18 de 19 de 21 de 26 de 28 de 6 de 13 de 20 de 28 de 31 de 30 de 31 de 30 de 31 de 7 de 31 de 7 de 31 de

enero enero enero feb... feb..

—— Calendario al mes —— Ejercido

Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año



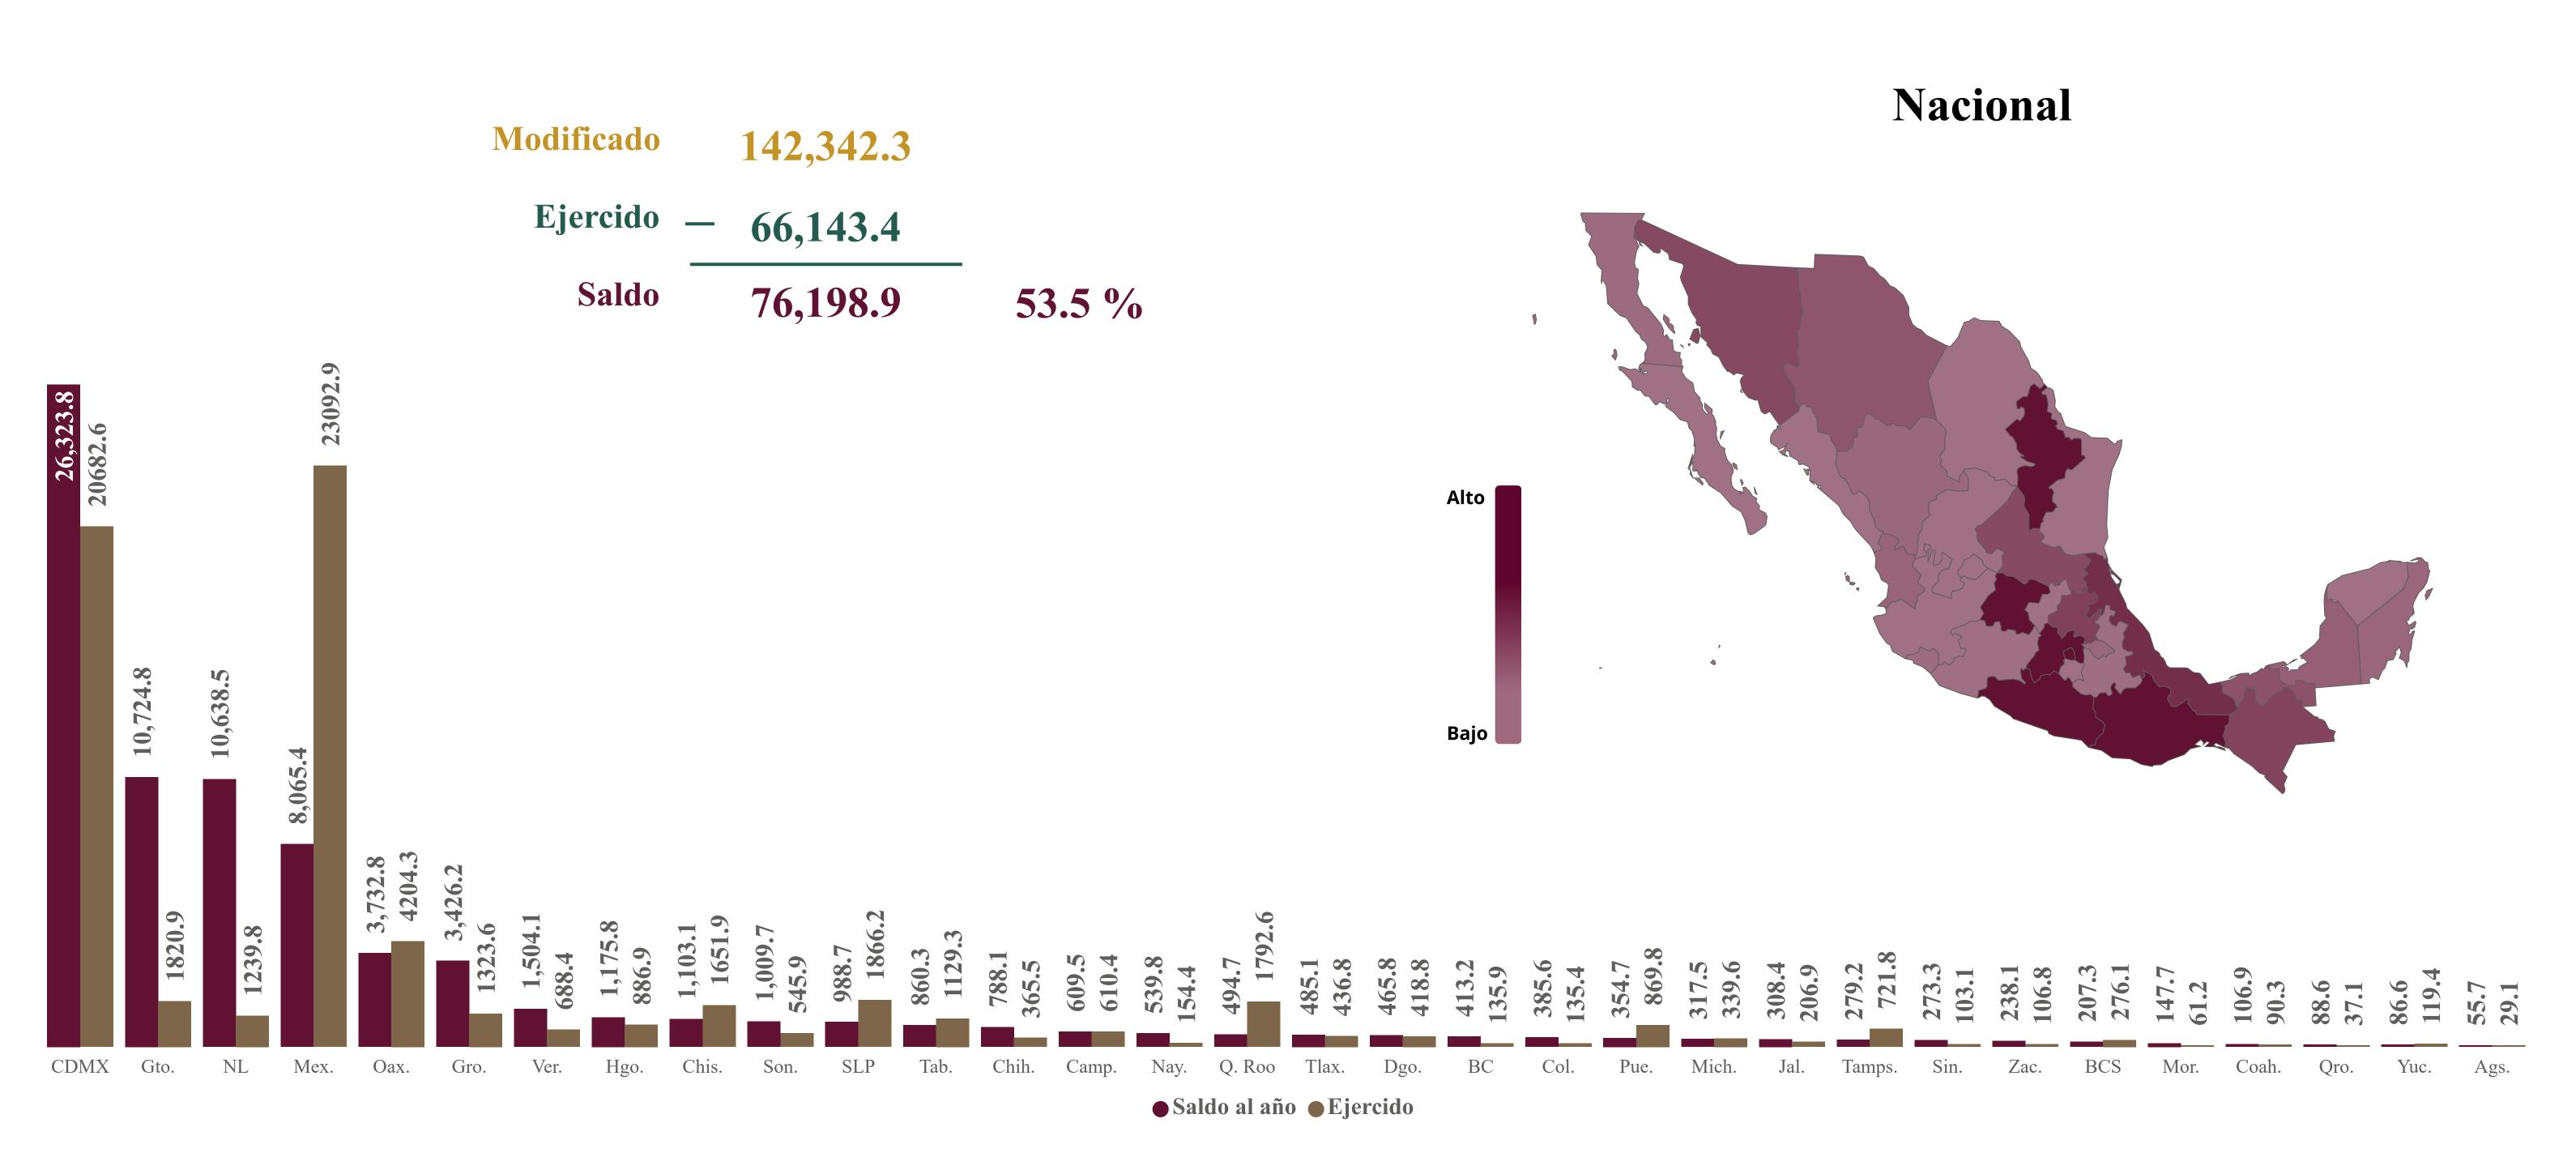

Bitácoras de obras nuevas

Fecha de Corte	Unidad	Pp	ID_Cv	Obras del SICT	Modificado
28 de agosto	644	K048	25092100002	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025	8.6
28 de agosto	635	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	103.3
21 de agosto	646	K031	25096460001	Ampliación y Modernización de la Carretera Alimentadora Guaymas - Yécora - Chihuahua Tramo Esperanza - Los Hornos Rosario	450.0
21 de agosto	300	K027	25093000001	Construcción de Senderos Seguros - San Luis Colorado, Sonora	50.0
21 de agosto	627	K048	11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	2.2
14 de agosto	626	K031	25096260003	Construcción de Puente Vehicular El Chical	21.6
14 de agosto	626	K031	25096260004	Construcción del Puente Vehicular La Presa, sobre el Camino: Ixtlahuacán - Las Presas	31.0
24 de julio	621	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	23.5
24 de julio	623	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	19.3
24 de julio	624	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	26.2
24 de julio	626	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	25.9
24 de julio	628	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	17.5
24 de julio	632	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	65.5
24 de julio	634	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	34.0
24 de julio	650	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	35.0
