
Fecha de corte 28 de nov 2024






Saldos pendientes de ejercer

52,373.7

47,935.0

50,817.3

94.3 %



2,882.3

4,438.7

Modificado

**Ejercido** 

Calendario al mes

**Avance** 

Saldo al corte

Saldo anual

627.8

831.6

#### **Carreteras Federales**

Saldo

7.4 %

**Original: 11,155.2** 

**Modificado: 11,728.8** 

Ejercido: 10,670.0 92.6 %

Calendario al mes: 11,526.9

Pagos en tramite en sistema: 34.7

Ejercido en la semana: 184.3

**Caminos Rurales y Alimentadores** 

10.3 %

**Original: 22,540.9** 

Modificado: 7,338.3

Saldo

Ejercido: 6,453.1 89.7 %

Calendario al mes: 7,191.9

Pagos en tramite en sistema: 20.3

Ejercido en la semana: 99.2

**Desarrollo Carretero** 

Saldo

29.7

0.4 %

**Original: 6,784.0** 

Modificado: 7,104.7

Ejercido: 6,951.7 99.6 %

Calendario al mes: 6,981.4

Pagos en tramite en sistema: 0.0

Ejercido en la semana: 0.0

Saldo

Resto

Hidalgo

Oaxaca

255.1 Durango

230.9 **Tlaxcala** 

230.0 Chiapas

**500** 

#### Conservación de Carreteras

Saldo

4.8 %

**Original: 19,318.5** 

**Modificado: 14,702.5** 

Ejercido: 13,102.7 95.2 %

Calendario al mes: 13,767.7

Pagos en tramite en sistema: --

Ejercido en la semana: 186.7

#### Servicios Técnicos



Saldo

8.3 %

Original: 324.2

Modificado: 207.4

Ejercido: 190.2 91.7 %

Calendario al mes: 207.4

Pagos en tramite en sistema: 0.1

Ejercido en la semana: 10.4

#### Ferroviario y Multimodal



**5.2 %** 

**Original: 9,092.0** 

**Modificado: 11,292.0** 

Ejercido: 10,567.4 94.8 %

Calendario al mes: 11,142.0

Pagos en tramite en sistema: 28.9

Ejercido en la semana: 41.2

### Saldos pendientes de ejercer

231.8

374.7 Construcción De La Carreter... Ampliación de la Línea 1 del ... 302.3

Camino Tayoltita - Lim. Edos... 253.1

230.9 **App Texcoco - Zacatepec** 

Rizo De Oro-La Concordia 2 ... 219.4


> 200 **400**

Fuente: Informe STG - Subsecretaría de Infraestructura (SSI) Versión: 2.03 - Dirección General de Planeación







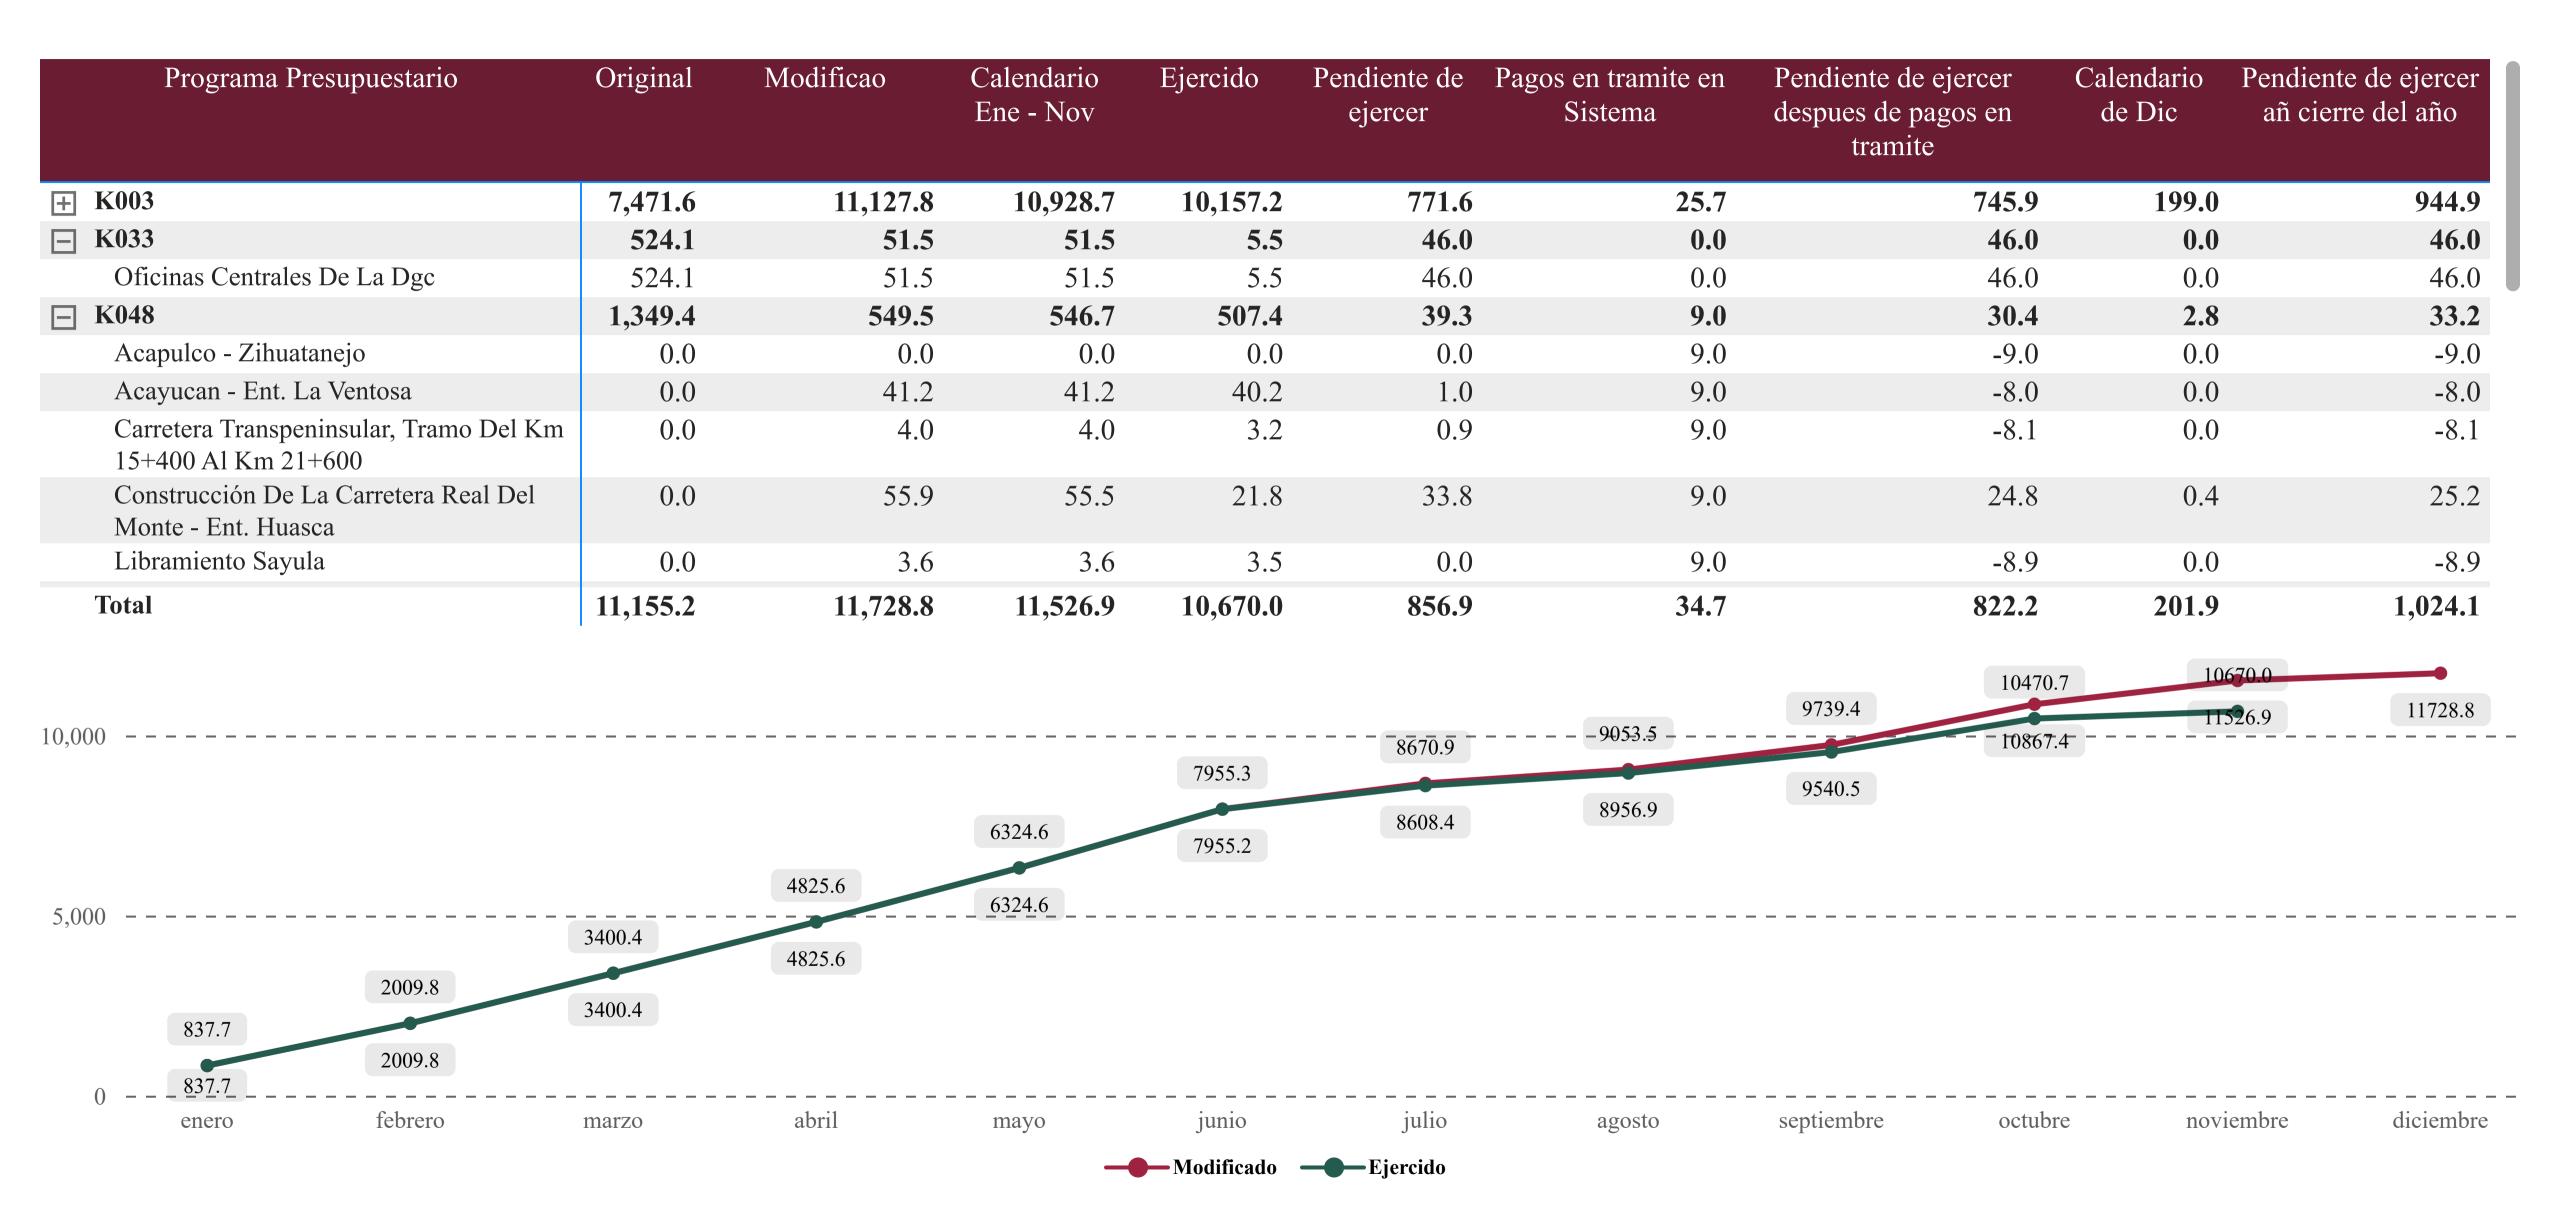






Todas






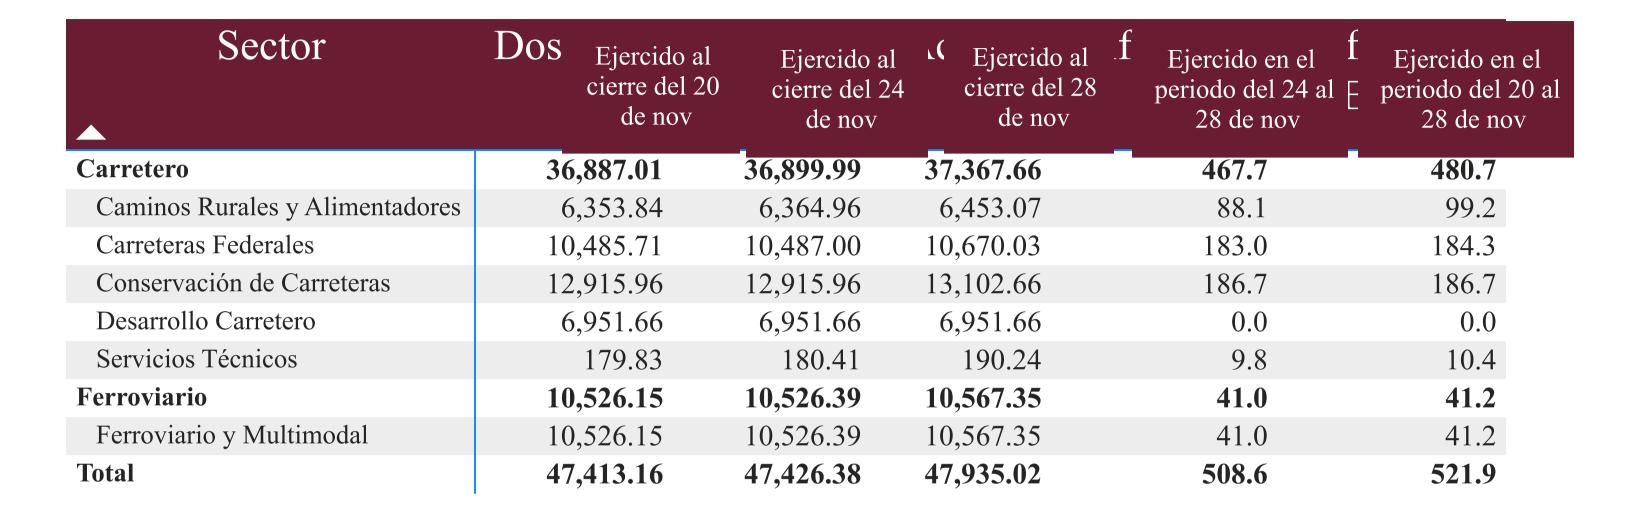

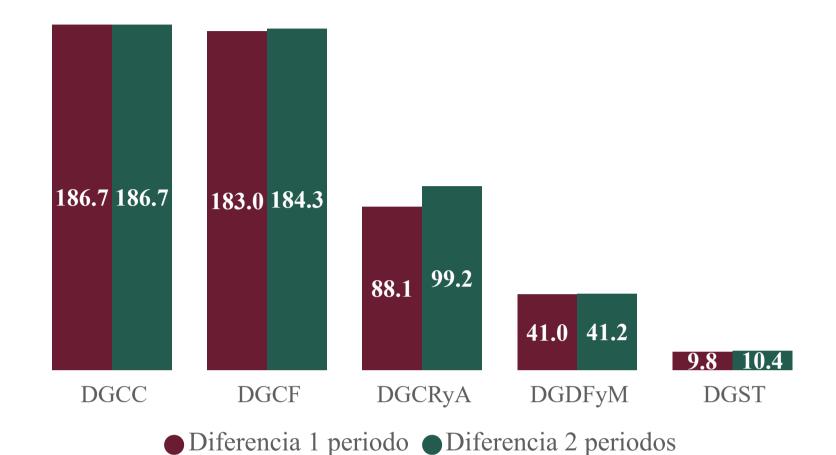

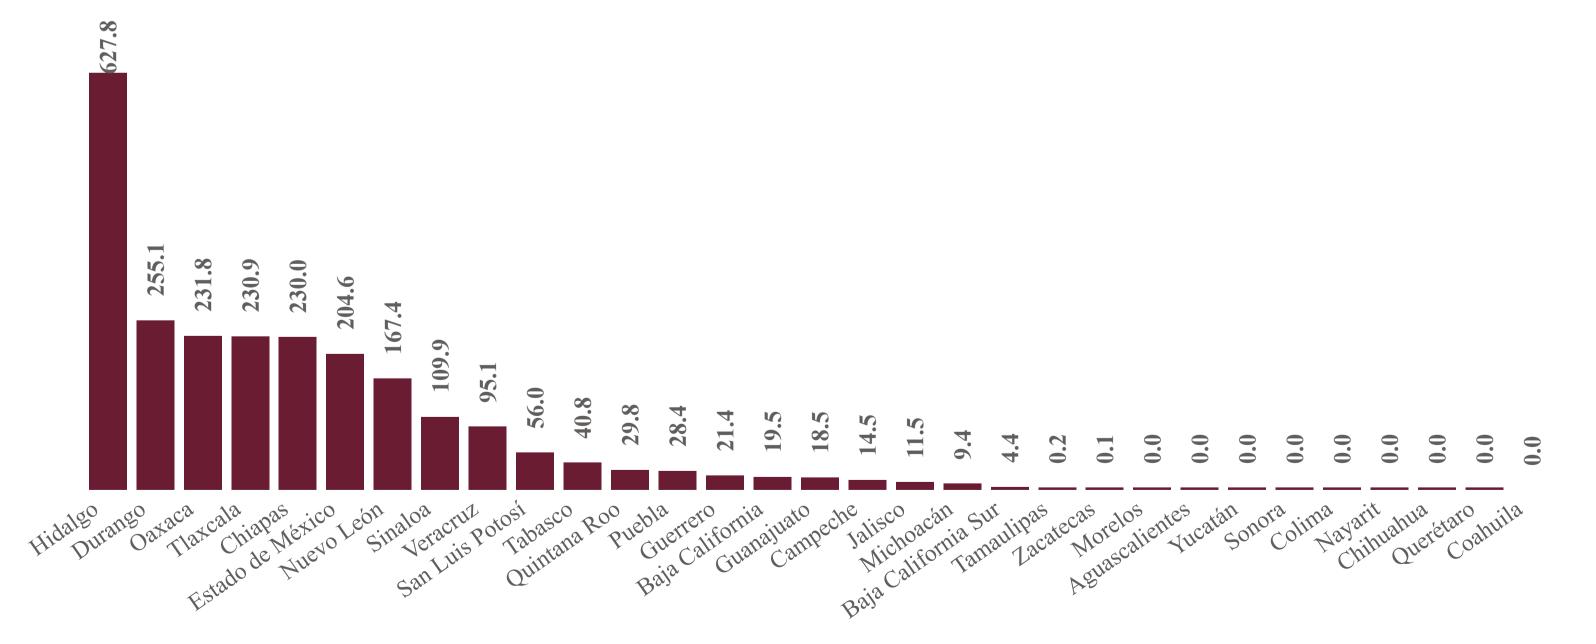










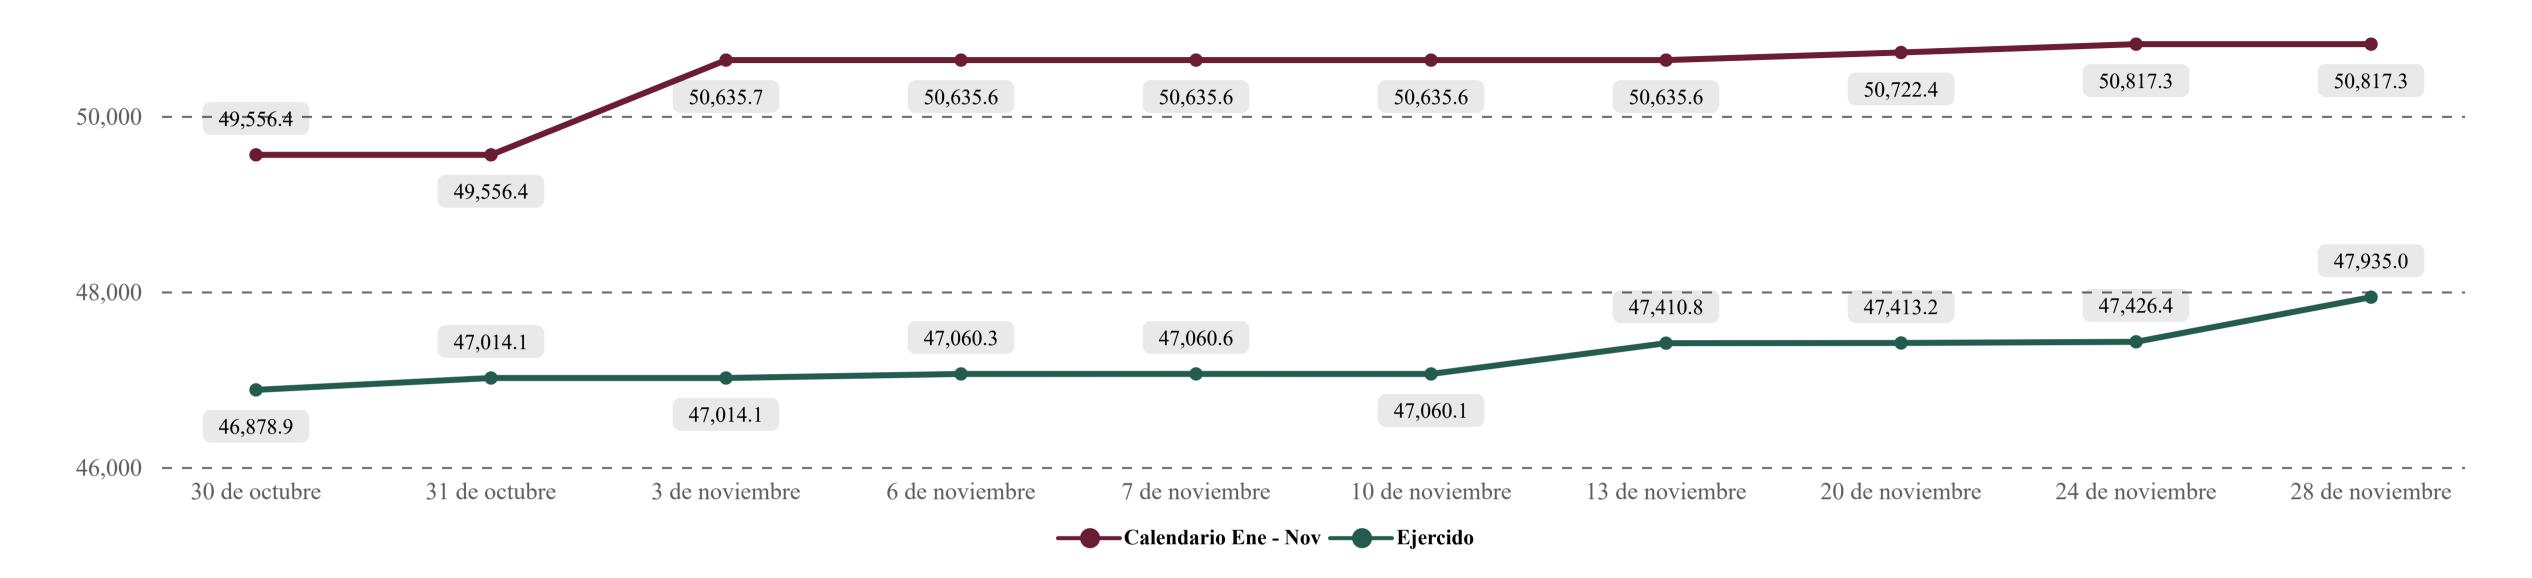

OBRA	Saldo
Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca	4,483.6
Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	3,030.9
Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin	2,692.3
Rizo De Oro-La Concordia 2 Puentes	2,236.8
App Texcoco - Zacatepec	2,228.8
Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México (Chalco Santa Marta) [Centro SICT Estado de México]	2,202.7
App Saltillo-Monterrey-La Gloria	1,732.0
Programa De Conservación De Infraestructura De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras 2024	1,291.9
App San Luis Potosí - Matehuala	1,260.4
Tren Interurbano México-Toluca	1,011.4
App Pirámides - Pachuca - Tulancingo	982.1
Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo.	981.4
