


Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Año

Mes


Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
<div>Central</div>	46,404.3	51,009.0	17,506.5	34.3 %	33,502.5	1,351.40	16,954.8	15,196.3
<div>Conservación de Carreteras</div>	23,638.8	19,854.5	6,731.3	33.9 %	13,123.2		7,749.9	5,373.3
<div>Caminos Rurales y Alimentadores</div>	15,720.4	11,481.8	931.5	8.1 %	10,550.3	1,351.40	3,370.3	5,828.6
<div>Carreteras Federales</div>	0.0	12,090.0	3,744.2	31.0 %	8,345.8		5,030.1	3,315.7
<div>Desarrollo Carretero</div>	7,045.1	6,495.1	5,931.9	91.3 %	563.3		474.1	89.2
<div>Servicios Técnicos</div>	0.0	550.0	167.2	30.4 %	382.9		330.4	52.5
<div>Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural</div>	0.0	537.0	0.0		537.0		0.0	537.0
<div>Dirección General de Recursos Materiales</div>	0.0	0.5	0.5	100.0 %	0.0		0.0	
<div>Coordinado</div>	92,000.0	91,757.3	38,835.6	42.3 %	52,921.6	15,476.57	11,999.1	25,446.0
<div>Desarrollo Ferroviario y Multimodal</div>	92,000.0	2,823.0	2,818.8	99.9 %	4.2	1.28	0.0	2.9
<div>Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario</div>	0.0	88,927.0	36,016.8	40.5 %	52,910.2	15,475.30	11,999.1	25,435.8
<div>Instituto Mexicano del Transporte</div>	0.0	0.0	0.0	100.0 %	0.0		0.0	
<div>Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano</div>	0.0	7.2	0.0		7.2		0.0	7.2
Total	138,404.3	142,766.3	56,342.2	39.5 %	86,424.1	16,828.06	28,953.9	40,642.2

Programación PEF

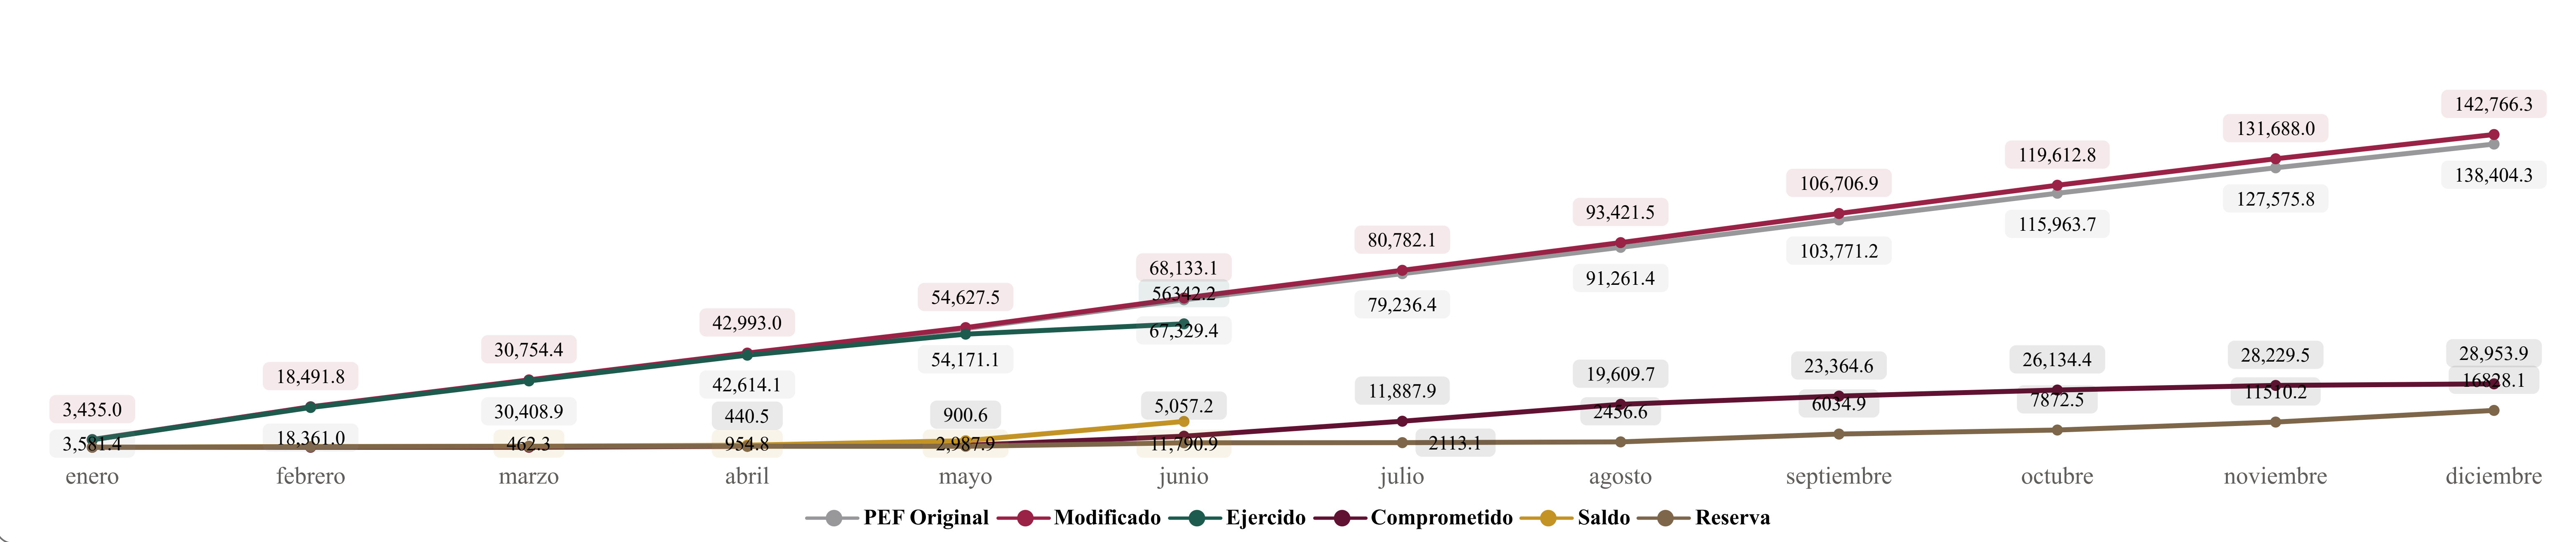


Ejercido en la semana por áreas


Unidad	Ejercido al cierre del 26 de jun	Ejercido al cierre del 30 de jun	Ejercido entre periodos	Saldo al año
Conservación de Carreteras	6,490.5	6,731.3	240.8	13,123.2
Caminos Rurales y Alimentadores	905.1	931.5	26.4	10,550.3
Carreteras Federales	3,631.8	3,744.2	112.4	8,345.8
Desarrollo Carretero	5,587.2	5,931.9	344.7	563.3
Servicios Técnicos	157.5	167.2	9.6	382.9
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	2,817.0	2,818.8	1.8	4.2
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario	35,637.8	36,016.8	379.0	52,910.2
Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural	0.0	0.0	0.0	537.0
Dirección General de Recursos Materiales	0.5	0.5	0.0	0.0
Instituto Mexicano del Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	0.0	0.0	0.0	7.2
Total	55,227.4	56,342.2	1,114.7	86,424.1

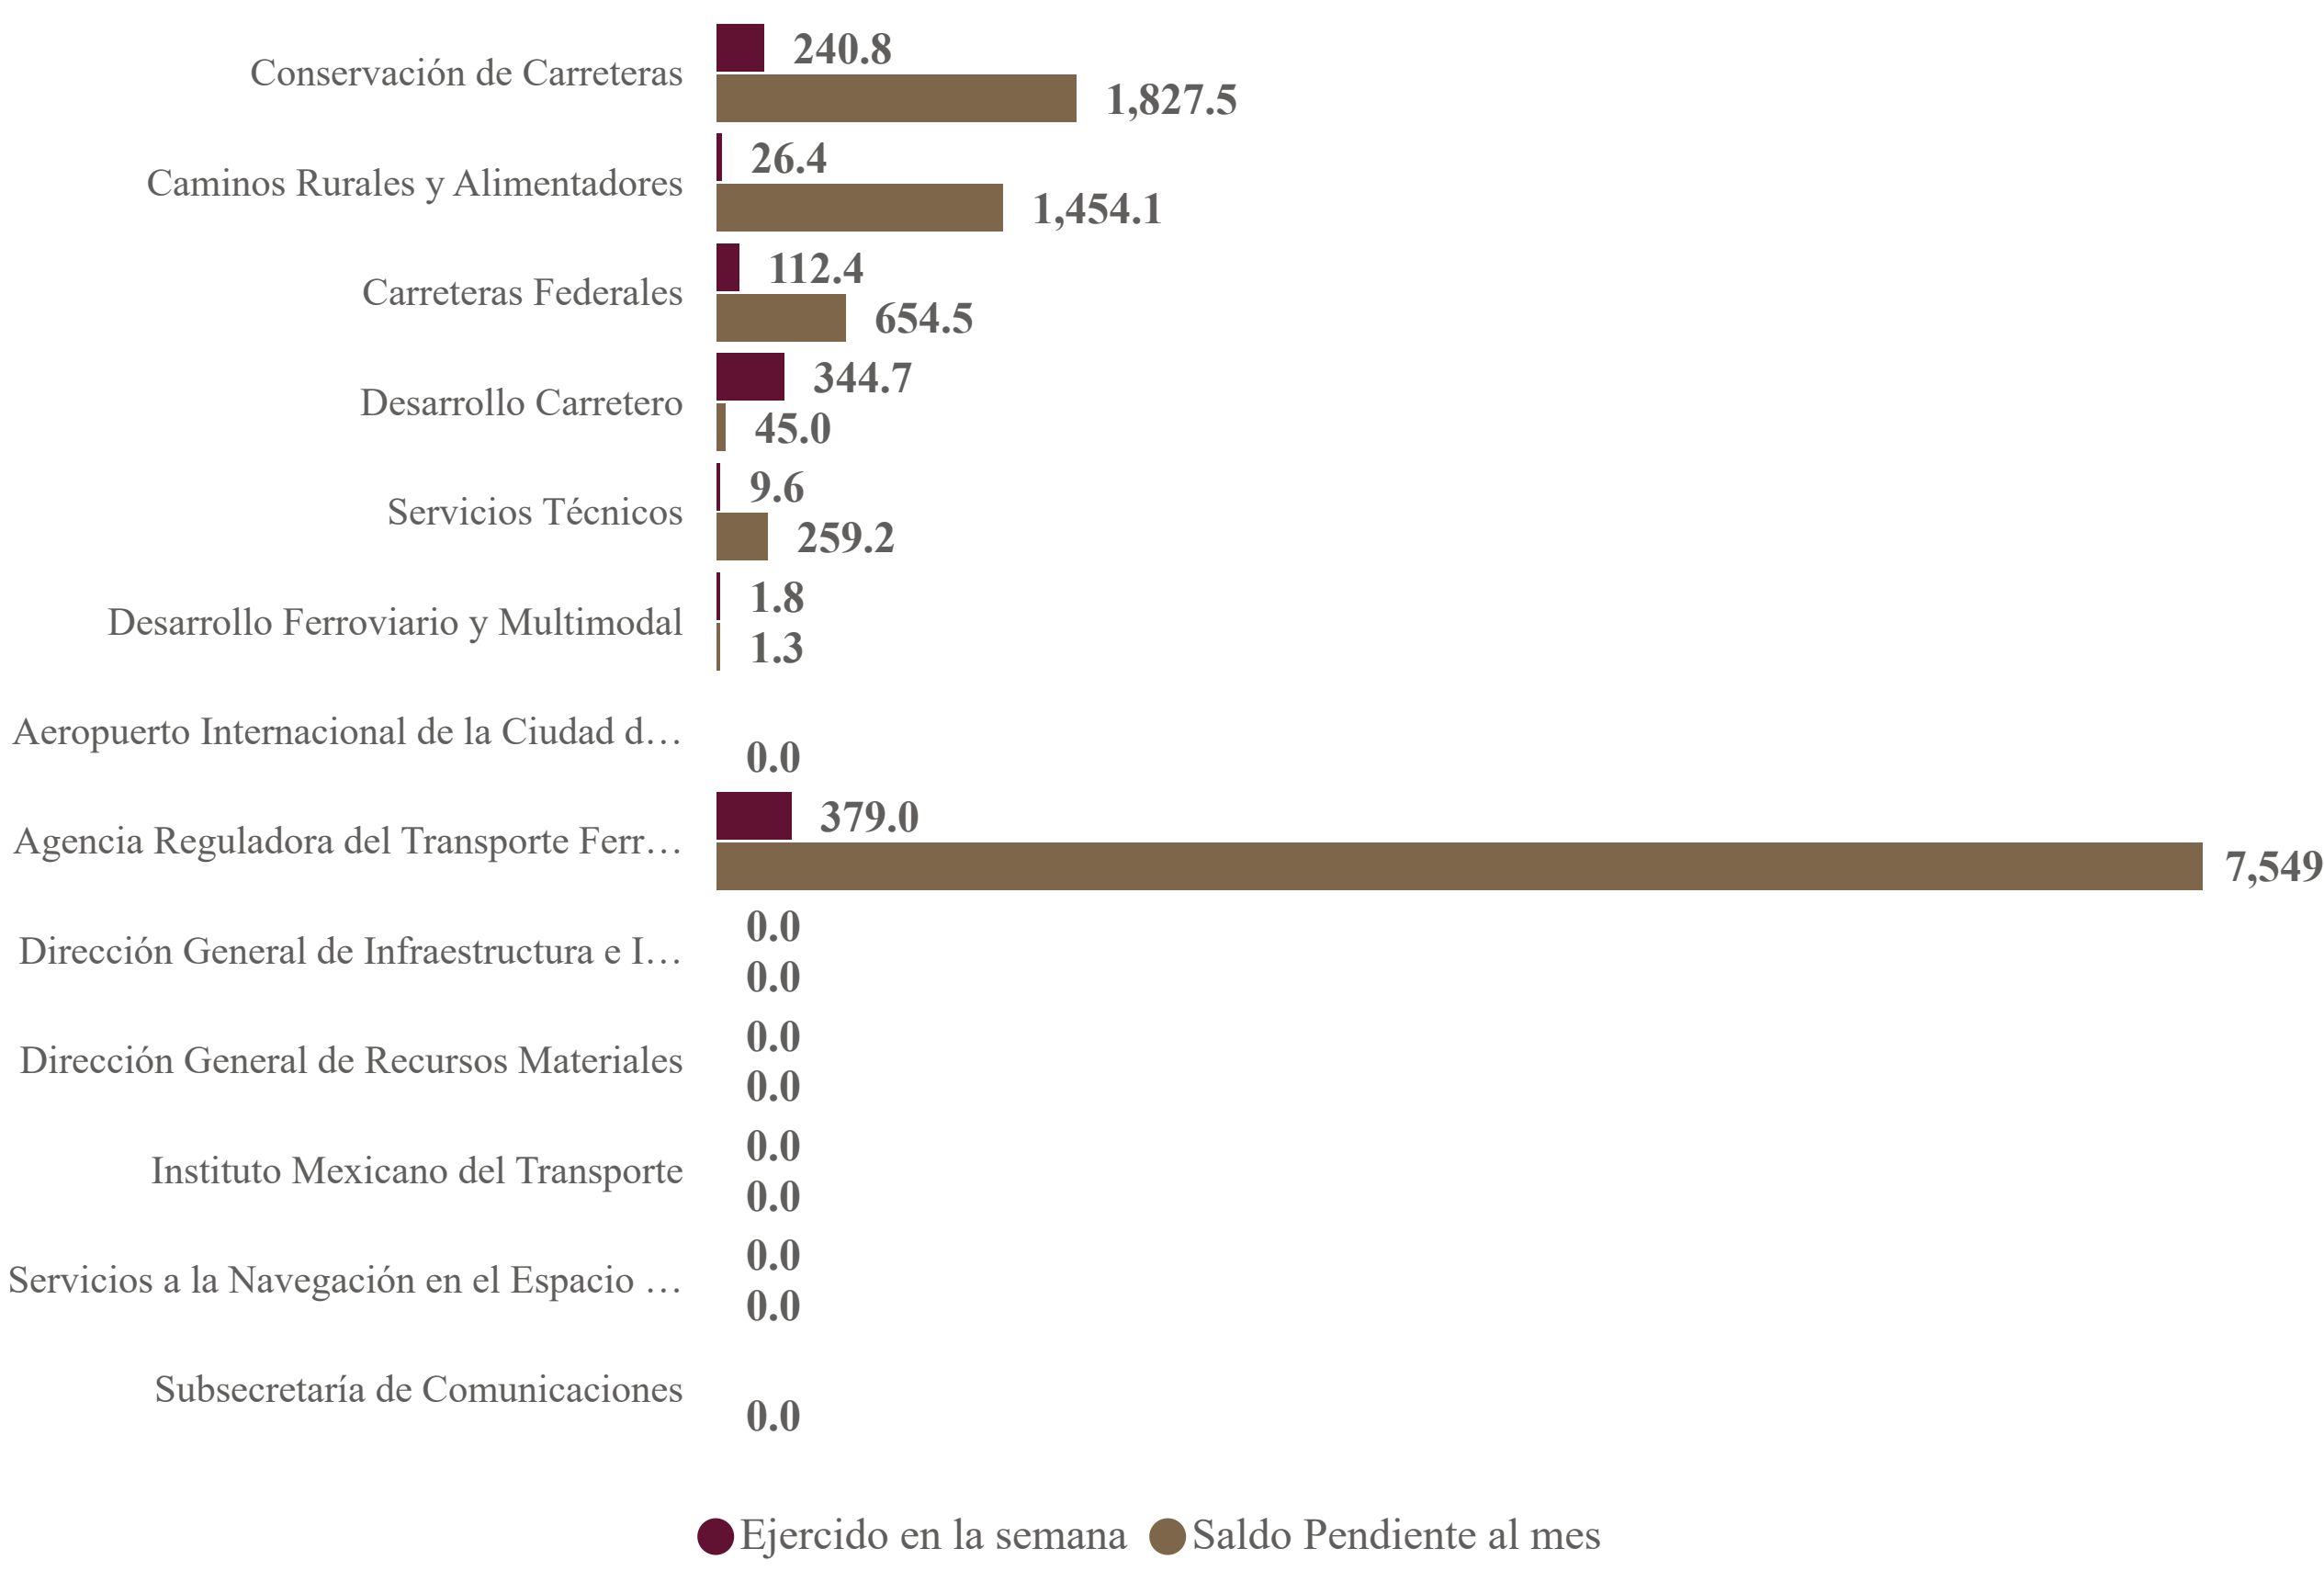

Histórico de ejercido

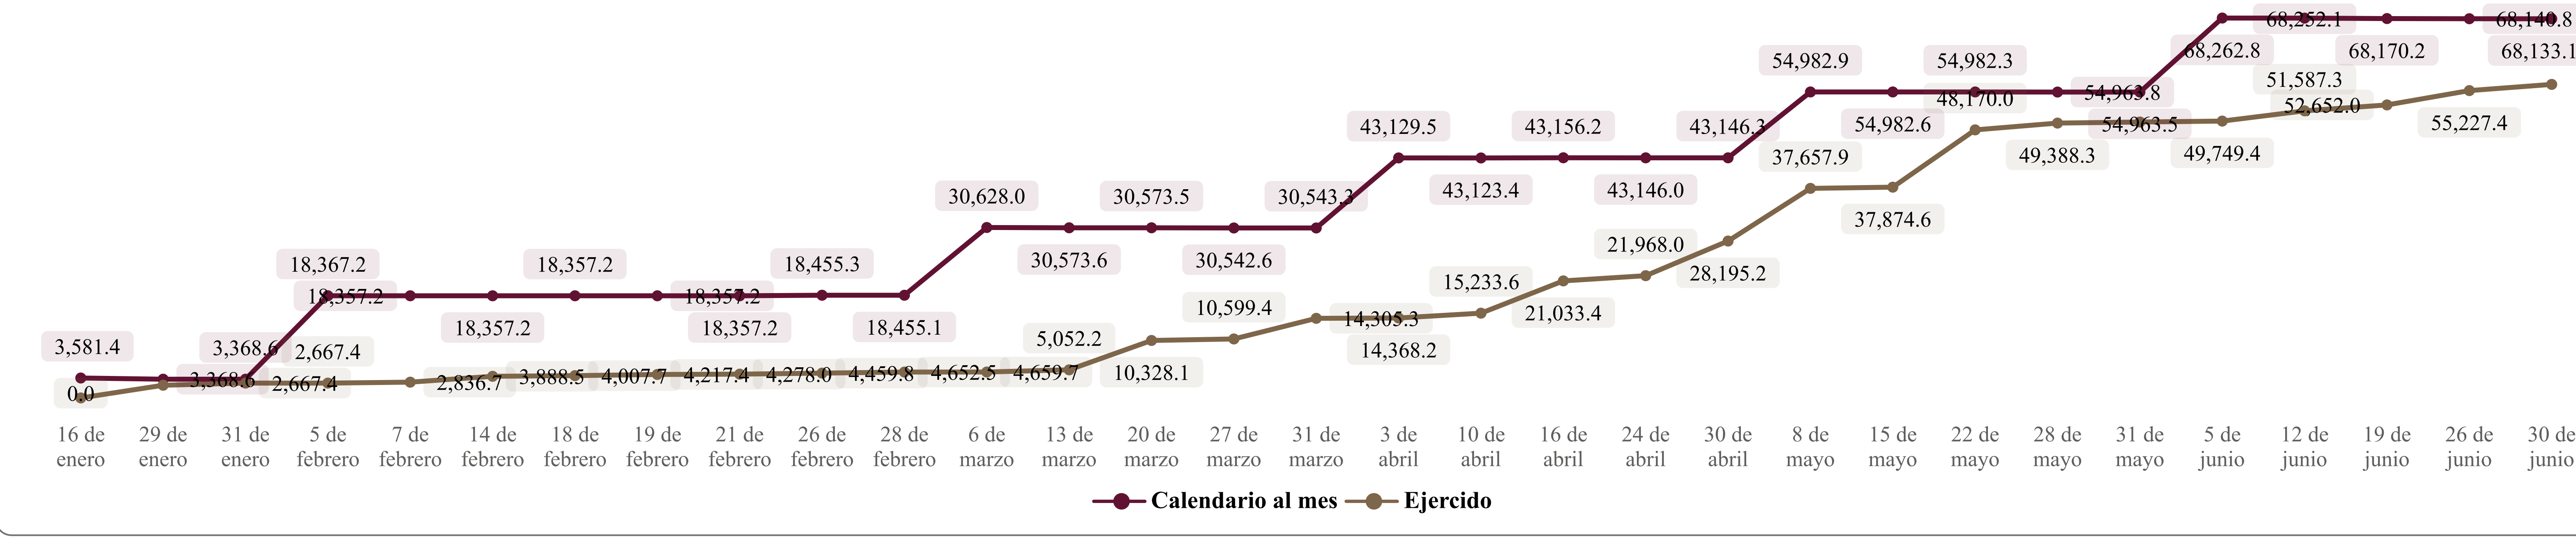

Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año

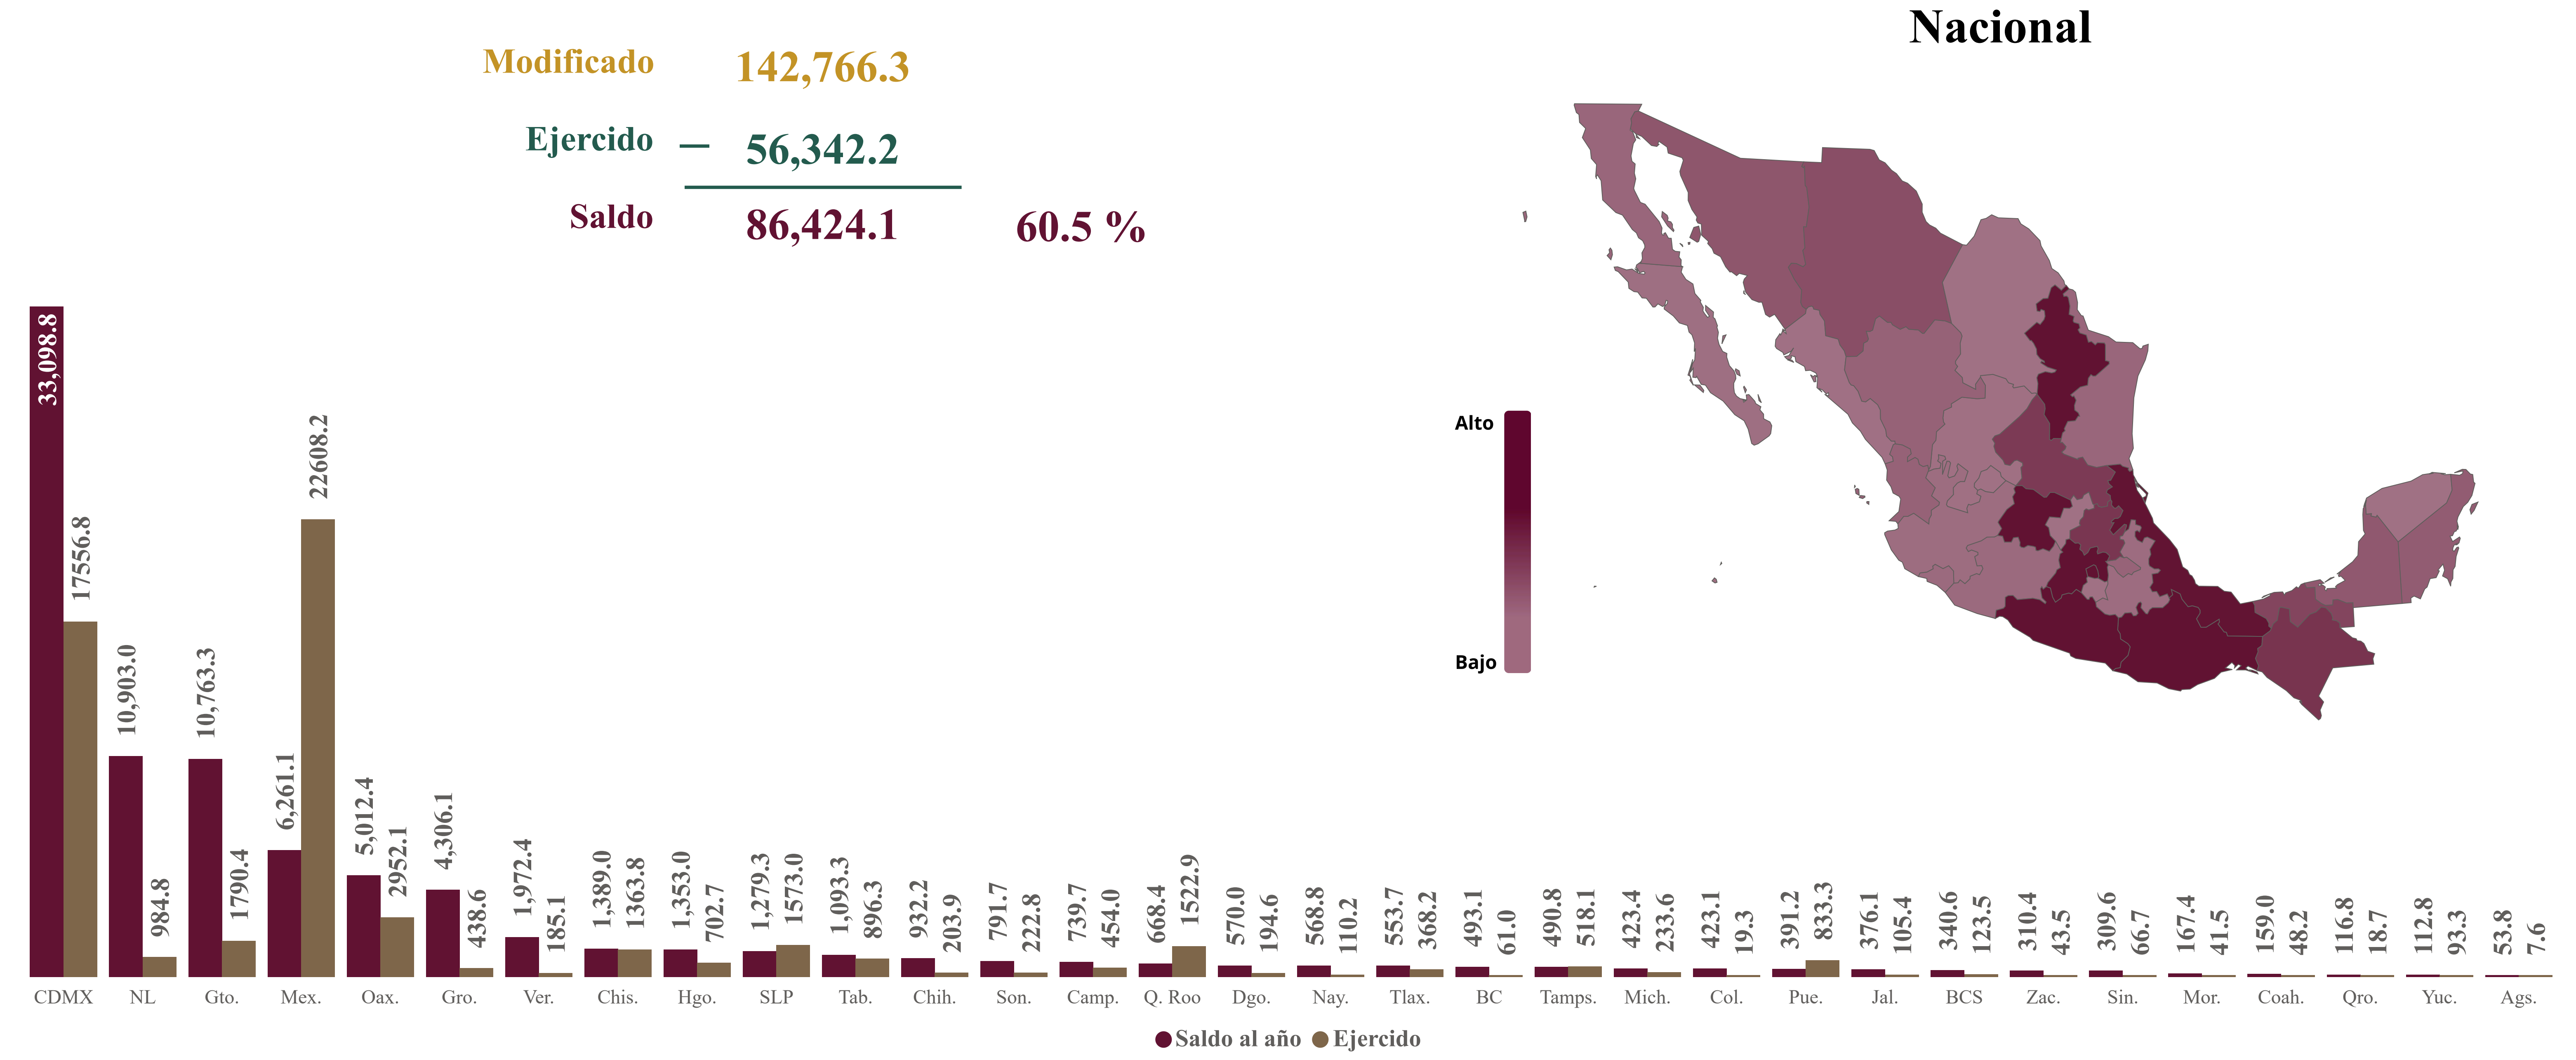

Bitácoras de obras nuevas

Fecha de Corte	Unidad	Pp	Clave de cartera	Obras del SICT	Modificado
8 de mayo	211	K032	25092110001	"Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT);	381.0
8 de mayo	631	G003	15092110002	1.- Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí)	825.5
8 de mayo	647	G003	15092110003	1.-Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa)	801.7
8 de mayo	212	K028	24092120001	Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2025	33.3
8 de mayo	D00	K041	20093110004	Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	2,823.0
8 de mayo	633	G003	16092110010	APP PIRÁMIDES - TULANCINGO - PACHUCA	670.9
8 de mayo	639	G003	16092110011	APP SALTILLO - MONTERREY - LA GLORIA	924.2
8 de mayo	644	G003	17092110010	APP SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA	878.2
8 de mayo	648	G003	17092110011	APP TAMPICO - CIUDAD VICTORIA	731.8
8 de mayo	650	K037	24092100006	Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por la Tormenta Tropical Nadine en el estado de Veracruz.	517.5
8 de mayo	637	K031	25096370002	Camino Cocoyoc - Ex-Hacienda El Hospital.	124.0
8 de mayo	646	K031	23096460001	Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) - Lim. Edos. Son. /Chi. Tramo del Km. 0+000 al Km. 21+400.	635.0
