

**Transportes** 

Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Subsecretaría de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura,

**Comunicaciones y Transportes** 

**Total** 

Agencia Reguladora del Transporte Subsecretaría de Comunicaciones y **Centro SCOP** Ferroviario Año

44.7 %

78,691.5

5,883.50

17,646.5


55,161.4

Mes Nom\_Sector Modificado A Ejercido C Saldo E=A-C Original Comprometido G **Disponible** Avance Reserva F Ejercido % H=E-F-G D=C/A42.8 % **□** Central 46,404.3 50,831.5 21,749.2 29,082.3 655.09 17,107.7 11,319.6 Conservación de Carreteras 23,638.8 20,109.3 8,763.2 43.6 % 11,346.1 7,029.5 4,316.6 2,476.2 22.4 % 8,555.7 Caminos Rurales y Alimentadores 15,720.4 11,031.8 655.09 5,261.6 2,638.9 12,077.0 36.1 % 7,711.3 Carreteras Federales 0.0 4,365.7 4,261.4 3,449.9 Desarrollo Carretero 7,045.1 6,495.1 5,931.9 91.3 % 563.3 554.3 200.6 Servicios Técnicos 550.0 36.5 % 349.4 168.9 180.5 0.0 Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural 0.0 517.7 2.1 % 506.6 377.3 129.3 Dirección General de Recursos Materiales 0.0 0.5 100.0 % 0.0 0.0 Subsecretaria de Comunicaciones y Transporte 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 **□** Coordinado 45.8 % 43,841.9 92,000.0 91,510.8 41,901.7 49,609.1 5,228.41 538.8 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 88,681.7 39,081.2 44.1 % 49,600.5 5,228.41 538.8 43,833.3 0.0Desarrollo Ferroviario y Multimodal 92,000.0 2,821.7 2,820.4 100.0 % 0.0 1.3 1.3 Instituto Mexicano del Transporte 0.1 42.6 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 0.0 0.00.0

138,404.3


142,342.3

63,650.8

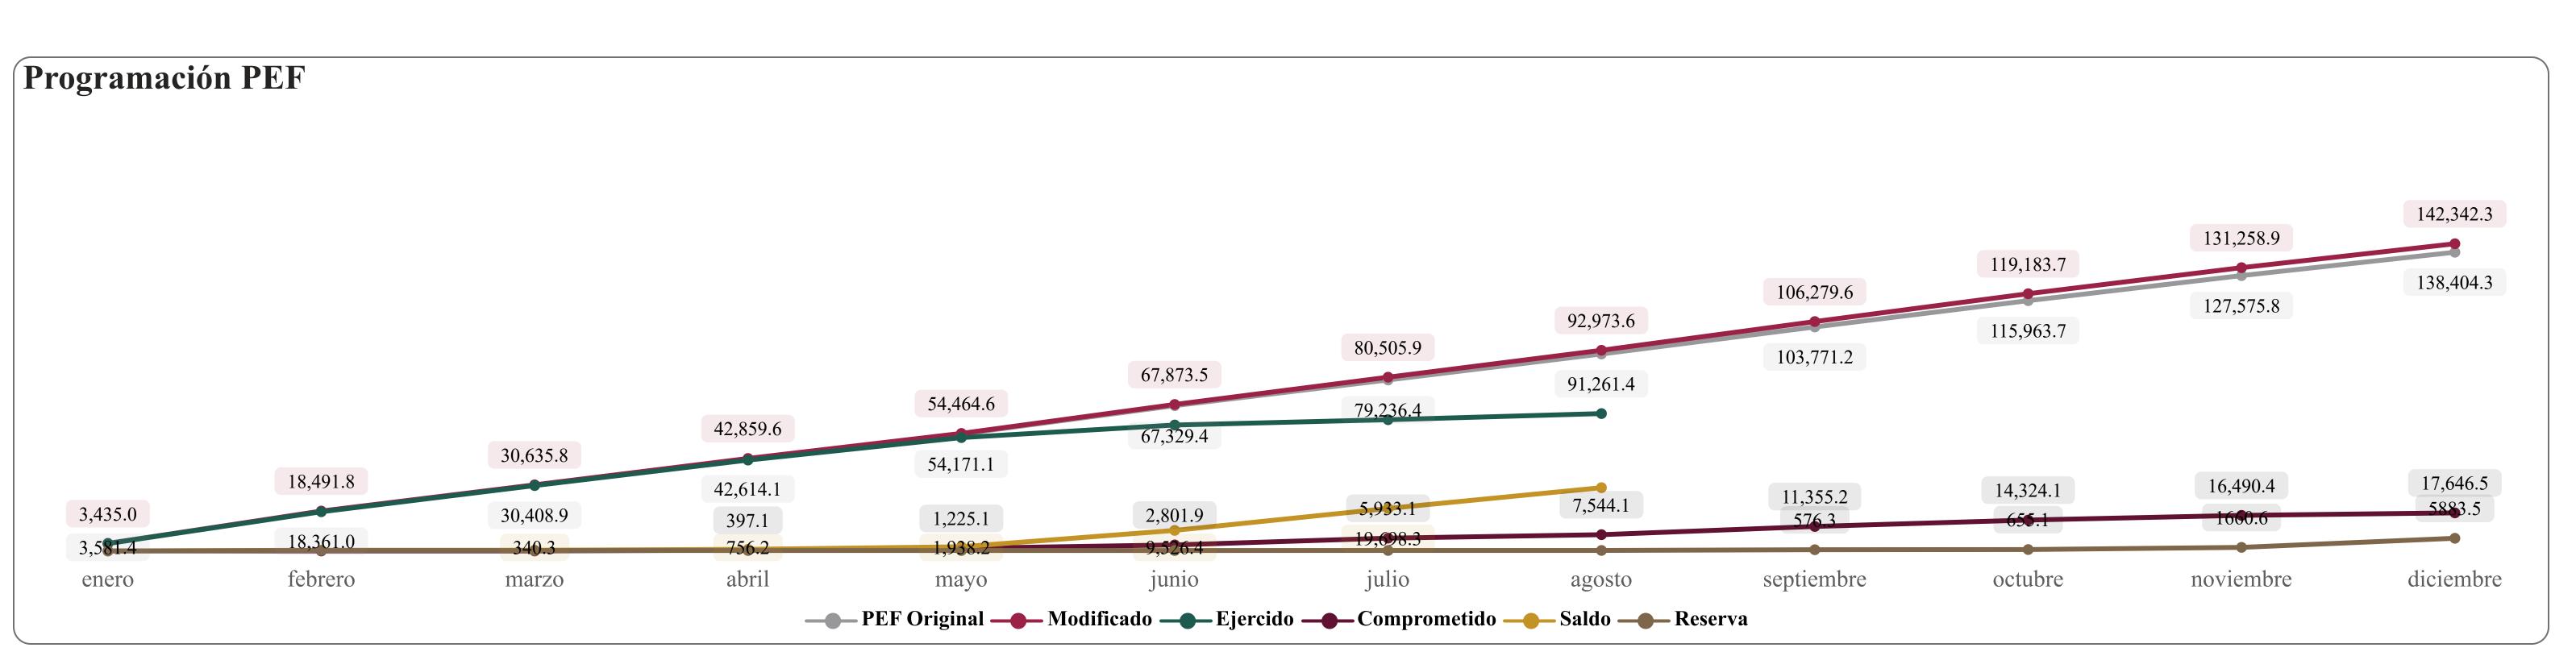

## Ejercido en la semana por áreas

Nom_Unidad	Ejercido al cierre	Ejercido al cierre	Ejercido entre	Saldo al año	
	del 14 de ago	del 21 de ago	periodos		
Conservación de Carreteras	7,756.8	8,763.2	1,006.4	11,346.1	
Caminos Rurales y Alimentadores	2,094.7	2,476.2	381.4	8,555.7	
Carreteras Federales	4,104.8	4,365.7	261.0	7,711.3	
Desarrollo Carretero	5,931.9	5,931.9	0.0	563.3	
Servicios Técnicos	167.2	200.6	33.4	349.4	
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario	38,459.2	39,081.2	622.0	49,600.5	
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	2,820.4	2,820.4	0.0	1.3	
Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural	0.0	11.1	11.1	506.6	
Dirección General de Recursos Materiales	0.5	0.5	0.0	0.0	
Instituto Mexicano del Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0	
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	0.0	0.0	0.0	7.2	
Subsecretaria de Comunicaciones y Transporte		0.0	0.0	50.0	
Total	61,335.5	63,650.8	2,315.3	78,691.5	

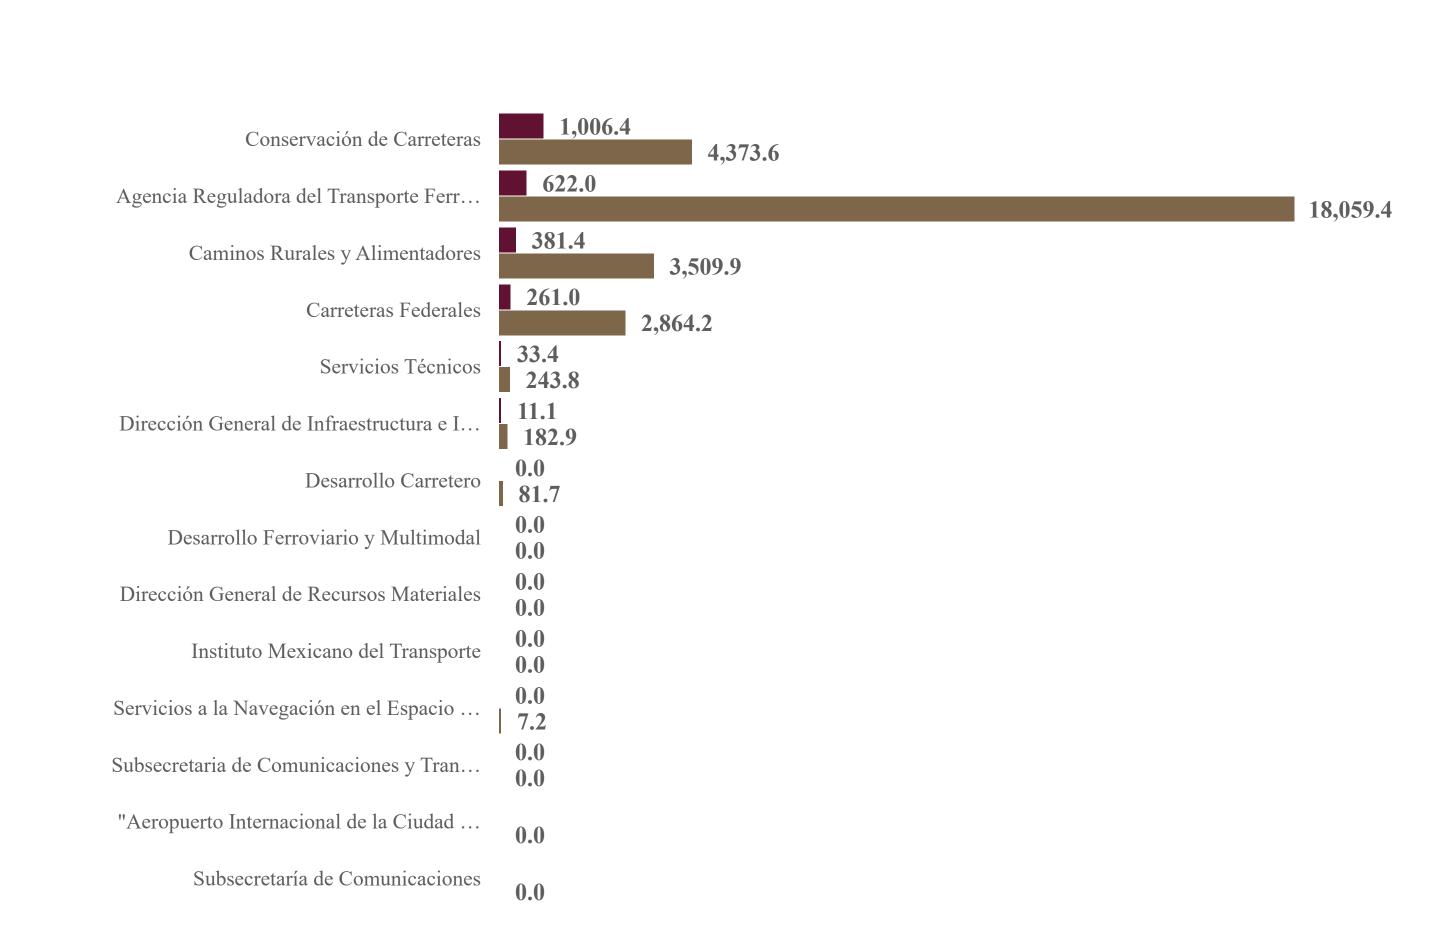


● Ejercido en la semana ● Saldo Pendiente al mes

Histórico de ejercido 80,781.9 80,781.2 92,973.6 68,170.2 68,262.8 80,781.3 80,528.2 63,650.8 59,342.8 57,947.4 56,457.9 54,982.9 54,982.3 68,252.1 68,133.1 61,335.5 43,129.5 43,156.2 43,146.3 58,621.4 57,166.1 55,227.4 54,963.5 51,587.3 30,543.3 30,573.5 43,123.4 43,146.0 37,874.6 28,195.2 18,367.2 18,357.2 18,455.3 15,233.6 30,542.6 30,573.6 21,968.0 5,052.2 3,581.4 3,368.6 18,357.2 18,455.1 18,357.2 14,305.3 10,328.1 14 de 18 de 19 de 21 de 26 de 28 de 6 de 13 de 20 de 27 de 31 de 3 de 10 de 16 de 24 de 30 de 31 de 30 de 31 enero enero enero febr... febr —— Calendario al mes —— Ejercido

## Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año



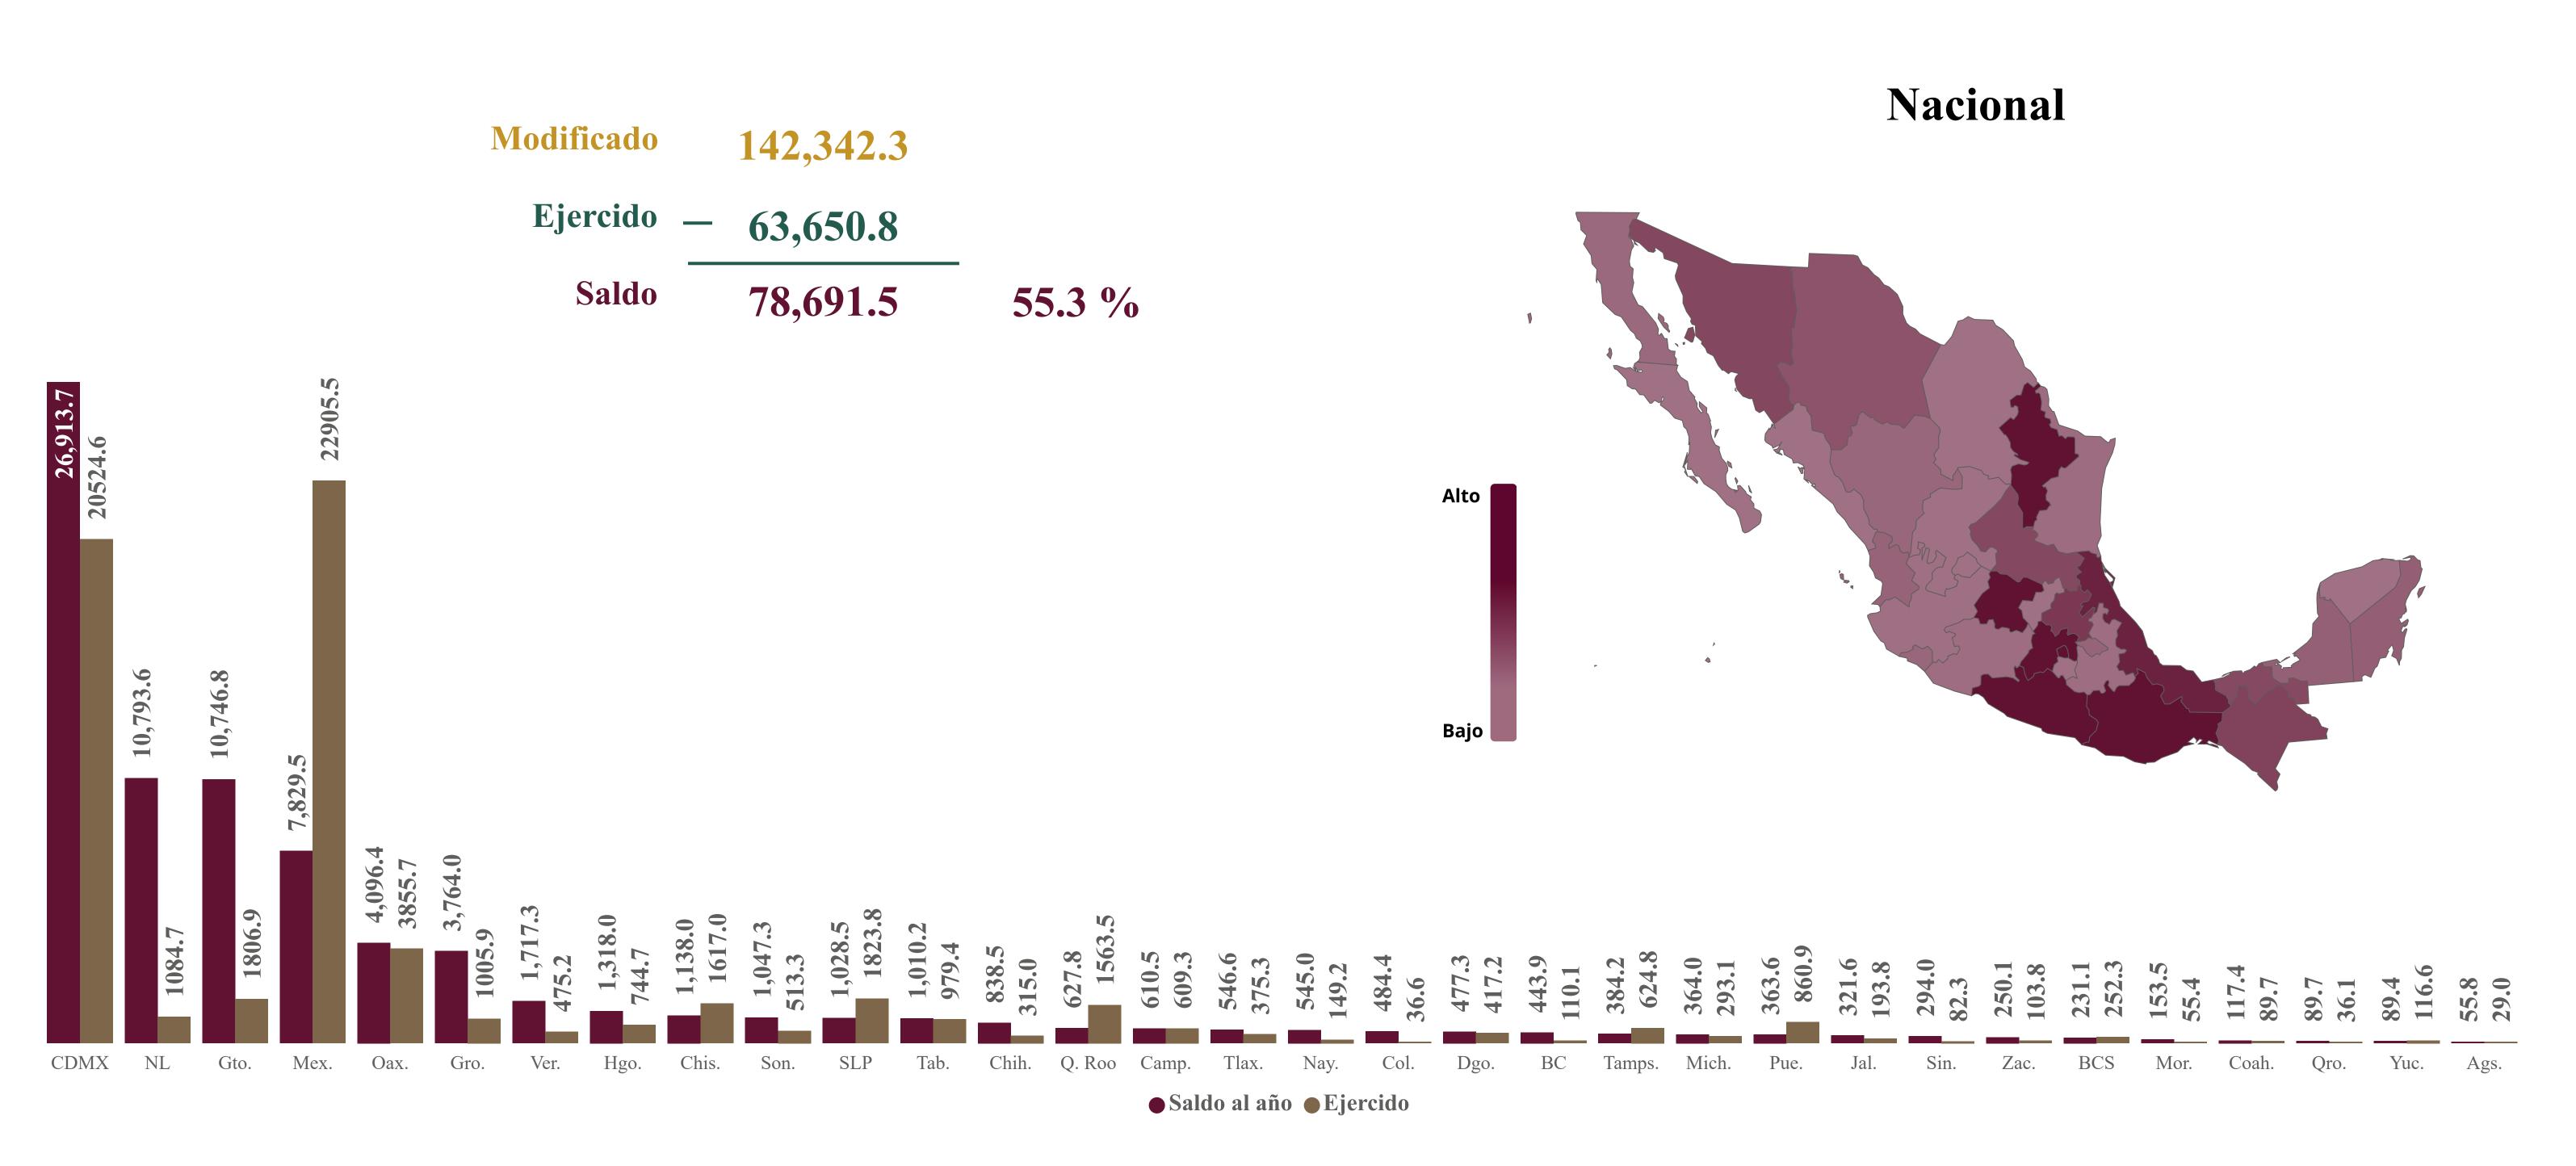

## Bitácoras de obras nuevas

Fecha de Corte	Unidad	Pp	ID_Cv	Obras del SICT	Modificado
21 de agosto	300	K027	25093000001	Nombre del proyecto pendiente	50.0
21 de agosto	646	K031	25096460001	Nombre del proyecto pendiente	450.0
21 de agosto	627	K048	11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	2.2
14 de agosto	626	K031	25096260003	Construcción de Puente Vehicular El Chical	21.6
14 de agosto	626	K031	25096260004	Construcción del Puente Vehicular La Presa, sobre el Camino: Ixtlahuacán - Las Presas	31.0
24 de julio	621	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	23.5
24 de julio	623	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	19.3
24 de julio	624	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	26.2
24 de julio	626	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	25.9
24 de julio	628	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	17.5
24 de julio	632	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	65.5
24 de julio	634	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	34.0
24 de julio	650	K032	25092110001	Programa de Abastecimiento de Materiales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)	35.0
30 de junio	624	K039	24092100004	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025.	0.0
30 de junio	627	K039	24092100004	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025.	0.0
