


Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Año

Mes

Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
<div>Central</div>	46,404.3	57,599.5	52,808.4	91.7 %	4,791.2		1,153.2	3,638.0
<div>+ Conservación de Carreteras</div>	23,638.8	21,787.2	19,785.6	90.8 %	2,001.6		969.2	1,032.3
<div>+ Caminos Rurales y Alimentadores</div>	15,720.4	10,689.0	9,177.6	85.9 %	1,511.4		98.8	1,412.6
<div>+ Carreteras Federales</div>	0.0	13,005.3	12,525.9	96.3 %	479.4		8.7	470.7
<div>+ Desarrollo Carretero</div>	7,045.1	10,917.6	10,167.6	93.1 %	750.0		74.8	675.2
<div>+ Servicios Técnicos</div>	0.0	550.0	548.2	99.7 %	1.8		0.0	1.8
<div>+ Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural</div>	0.0	549.9	502.9	91.5 %	47.0		1.7	45.4
<div>+ Dirección General de Recursos Materiales</div>	0.0	0.5	0.5	100.0 %	0.0		0.0	
<div>+ Subsecretaria de Comunicaciones y Transporte</div>	0.0	100.0	100.0	100.0 %	0.0		0.0	
<div>Coordinado</div>	92,000.0	80,890.0	66,791.2	82.6 %	14,098.8	1,885.55	4,567.5	7,645.7
<div>+ Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario</div>	0.0	75,935.2	61,972.2	81.6 %	13,963.1	1,885.55	4,567.2	7,510.3
<div>+ Desarrollo Ferroviario y Multimodal</div>	92,000.0	4,947.4	4,812.2	97.3 %	135.3		0.3	135.0
<div>+ Instituto Mexicano del Transporte</div>	0.0	0.1	0.1	63.9 %	0.0		0.0	0.0
<div>+ Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano</div>	0.0	7.2	6.8	94.1 %	0.4		0.0	0.4
Total	138,404.3	138,489.5	119,599.5	86.4 %	18,890.0	1,885.55	5,720.7	11,283.7


Nota: Se incorporan las cifras de la reserva a partir del 10 de abril de 2025.

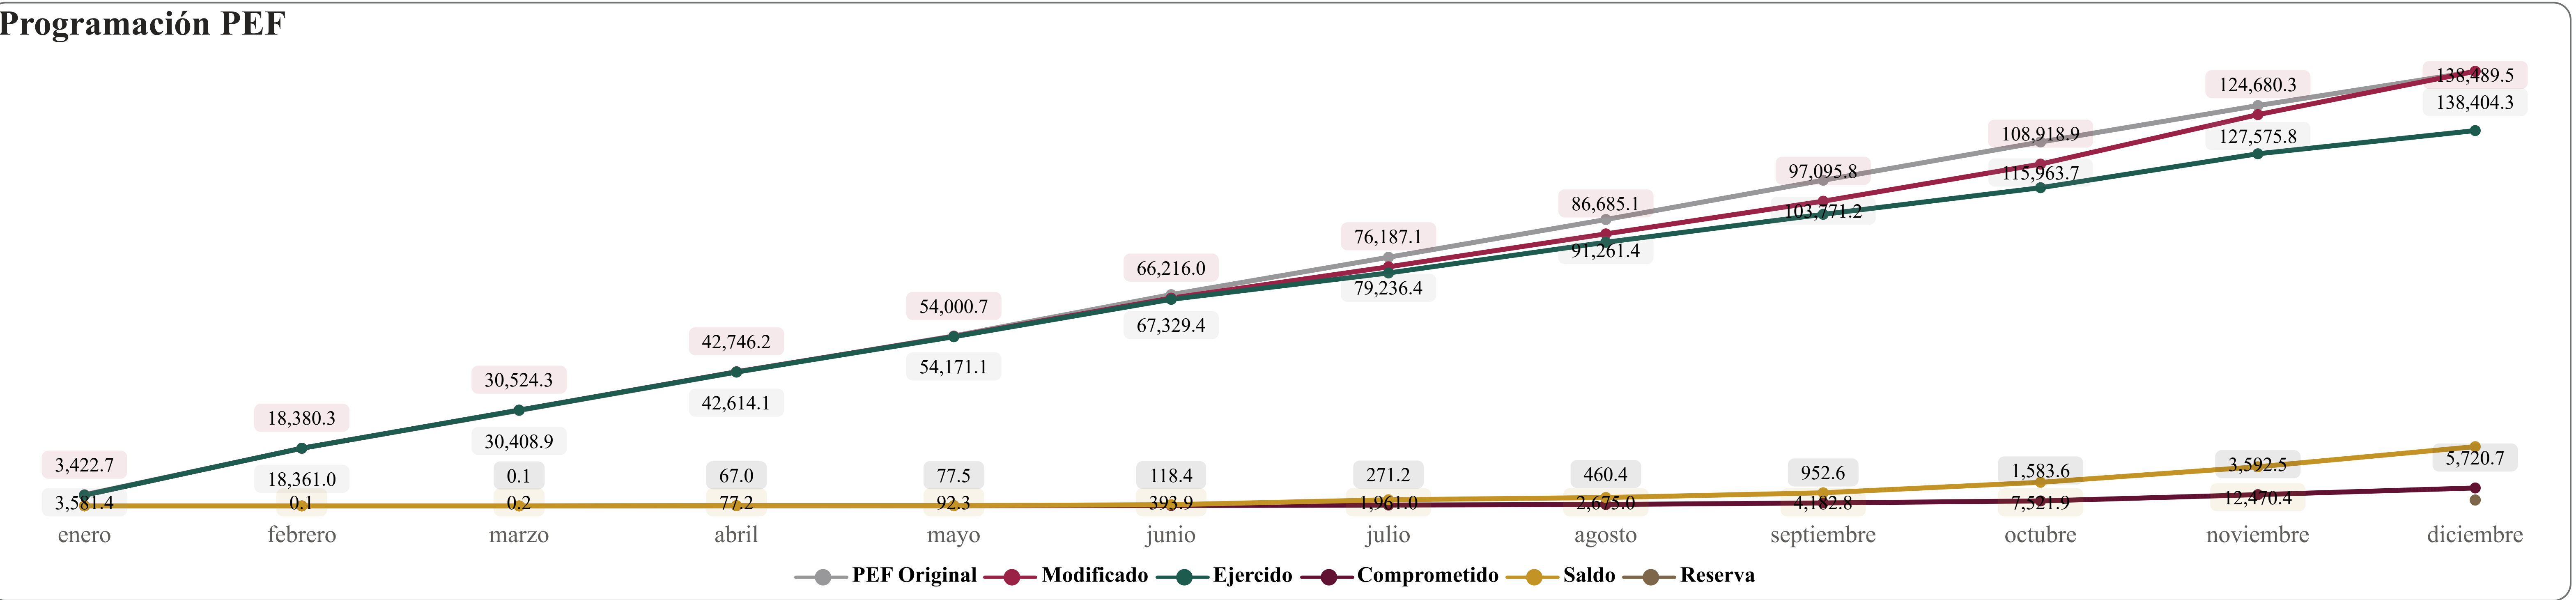




# Ejercido en la semana por áreas

Nom_Unidad	Ejercido al cierre del 22 de ene	Ejercido al cierre del 29 de ene	Ejercido entre periodos	Saldo al año
Conservación de Carreteras	19,786.33	19,785.6	-0.7	2,001.6
Caminos Rurales y Alimentadores	9,177.64	9,177.6	-0.1	1,511.4
Carreteras Federales	12,525.89	12,525.9	0.0	479.4
Desarrollo Carretero	10,167.65	10,167.6	0.0	750.0
Servicios Técnicos	548.23	548.2	0.0	1.8
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario	61,972.15	61,972.2	0.0	13,963.1
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	4,812.16	4,812.2	0.0	135.3
Dirección General de Infraestructura e Instalaciones Destinadas al Sistema Educativo Federal y Cultural	502.92	502.9	0.0	47.0
Dirección General de Recursos Materiales	0.50	0.5	0.0	0.0
Instituto Mexicano del Transporte	0.08	0.1	0.0	0.0
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	6.80	6.8	0.0	0.4
Subsecretaria de Comunicaciones y Transporte	100.00	100.0	0.0	0.0
Total	119,600.35	119,599.5	-0.8	18,890.0

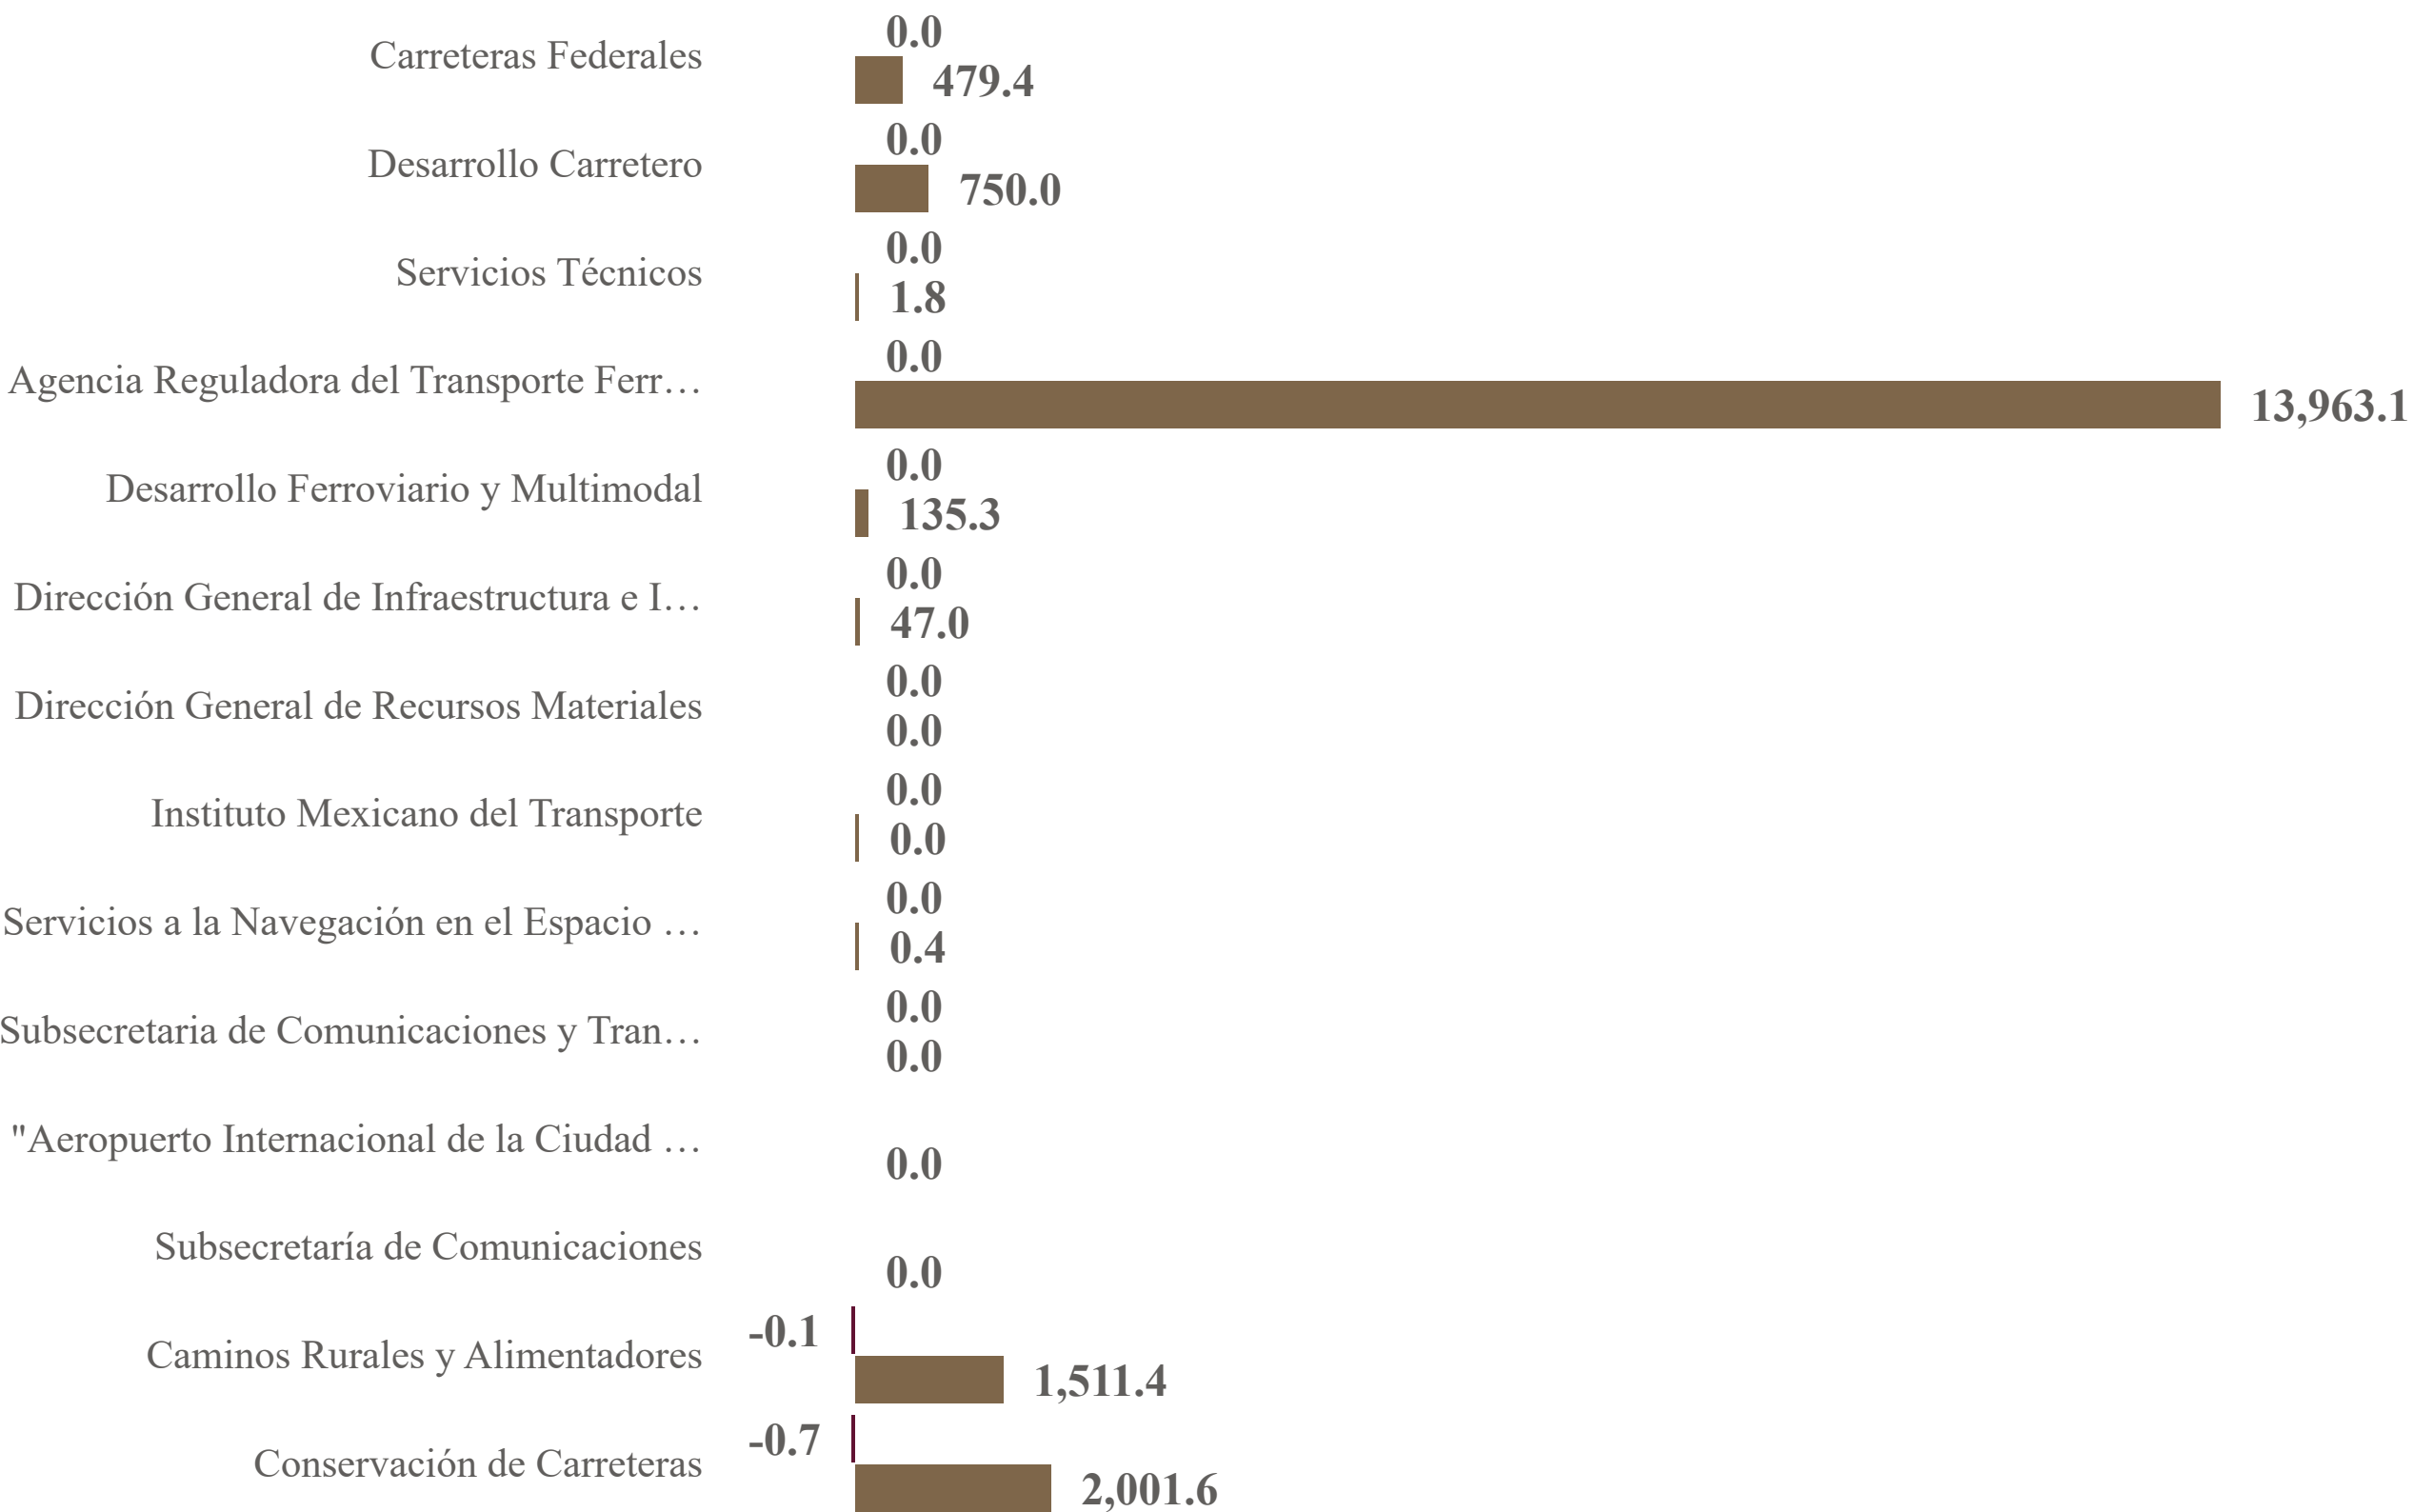

● Ejercido en la semana ● Saldo Pendiente al mes

## Histórico de ejercido

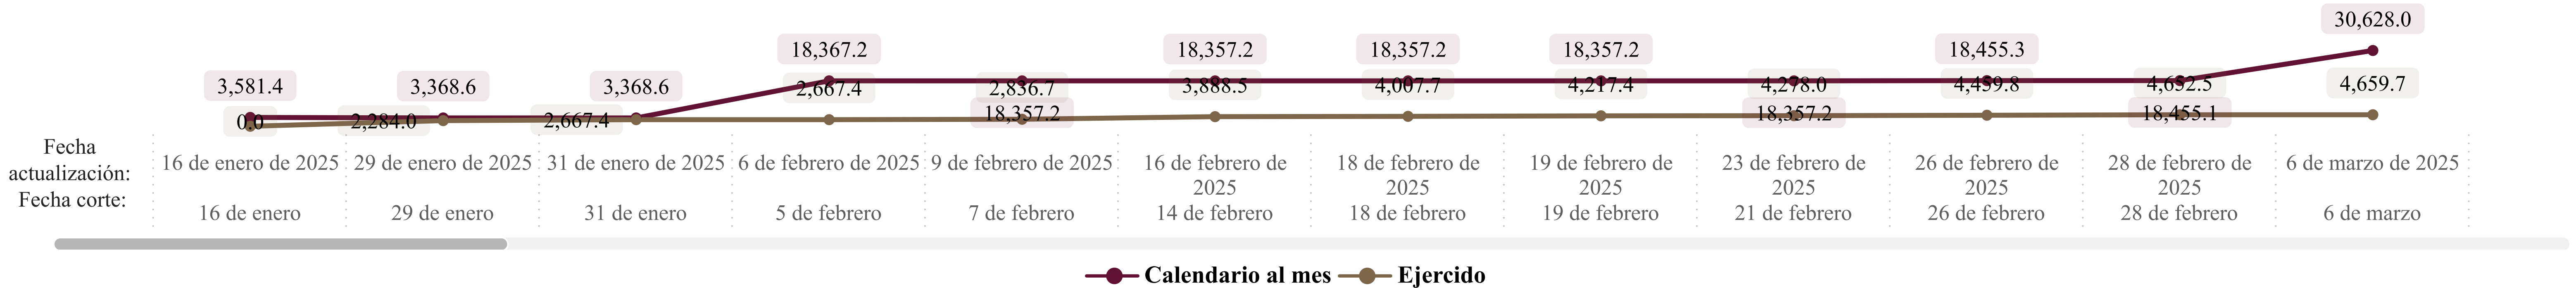

# Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año




Nacional

Modificado 138,489.5

Ejercido — 119,599.5

Saldo 18,890.0 13.6 %

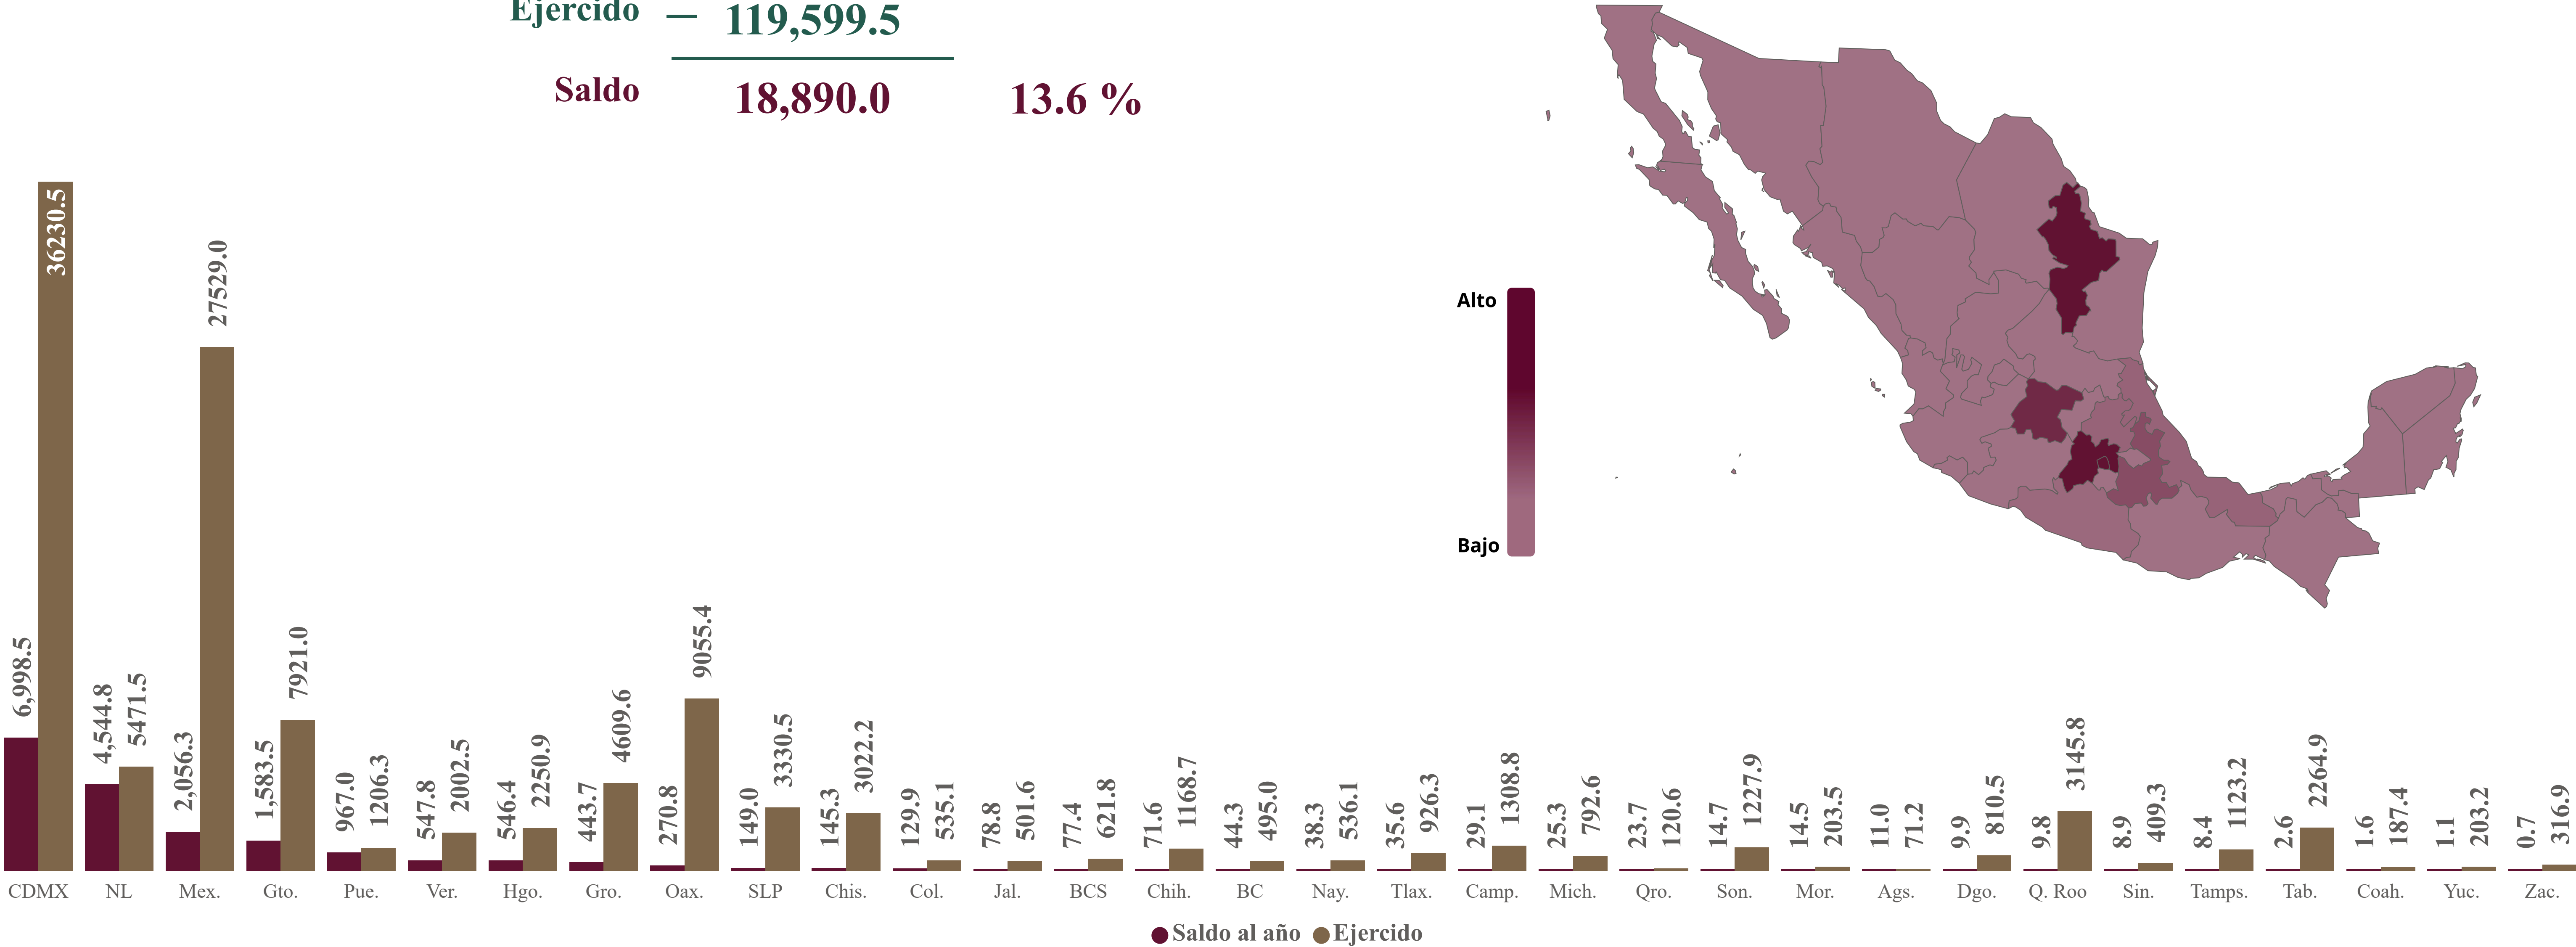





# Registro de obras nuevas

▼ Fecha de Corte	Unidad	Pp	ID_Cv	Obras del SICT	Modificado
18 de diciembre	633	K037	24092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025.	415.9
18 de diciembre	642	K037	24092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025.	15.5
18 de diciembre	644	K037	24092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025.	23.9
31 de octubre	641	K048	25092100002	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025	0.1
9 de octubre	626	K033	24092100002	Programa de estudios y proyectos de carreteras 2025	20.0
30 de septiembre	637	K037	24092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025.	114.3
18 de septiembre	645	K037	24092100003	Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2025.	20.0
18 de septiembre	641	K048	25096410002	Puebla-Huajuapán de León, Tramo: El Pitayo-Acatlán de Osorio	15.0
18 de septiembre	634	K048	25096340001	Puente Amado Nervo (Federación)	30.0
18 de septiembre	638	K048	25096340001	Puente Amado Nervo (Federación)	20.0
11 de septiembre	300	K027	25093000005	Construcción de Senderos Seguros 10 Municipios Estado de México	56.0
4 de septiembre	300	K027	25093000003	Construcción de Senderos Seguros- Valle de Chalco, Estado de México	14.5
4 de septiembre	623	K048	25092100002	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025	3.8
4 de septiembre	624	K048	25092100002	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025	2.0
4 de septiembre	627	K048	25092100002	Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2025	0.6
